


# MAS Sokolovsko o.p.s.

## Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko

Vypracováno za období 7/2009-6/2015

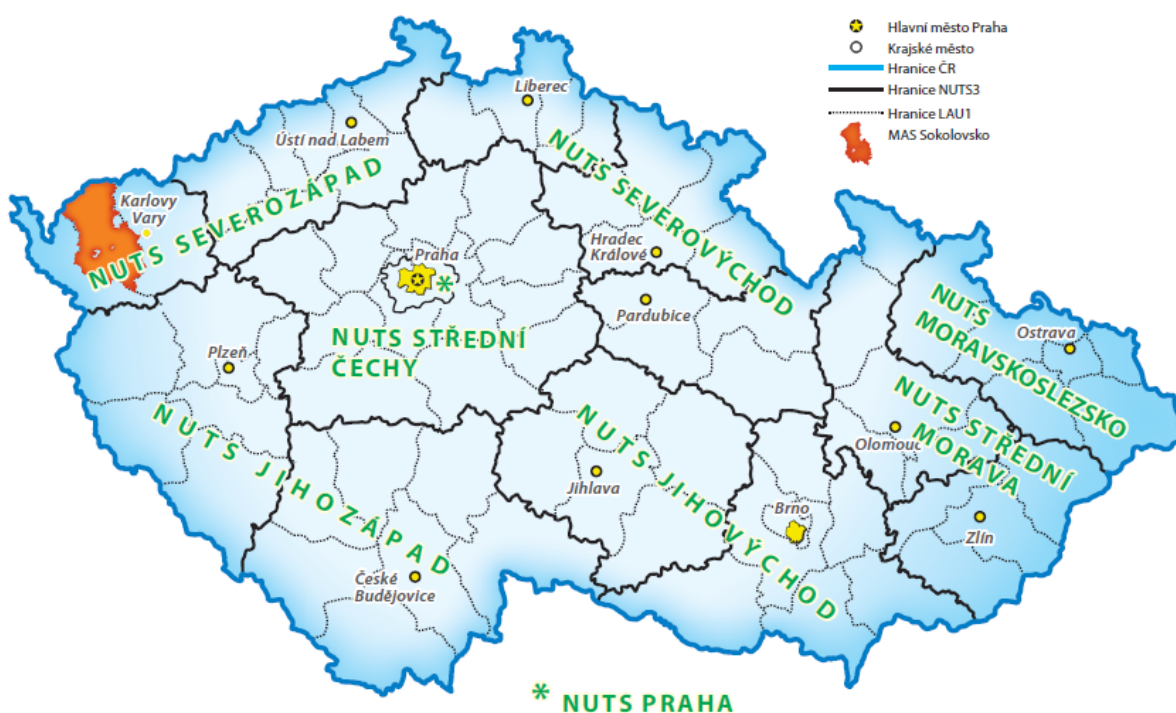

Vypracovala:

Ing. Ivana Jágriková ve spolupráci firmou AgAkcent, s.r.o.

Datum vypracování zprávy:

prosinec 2015

Podpis statutárního zástupce:



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## OBSAH

<b>1. Úvod .....</b>	<b>5</b>
1.1 Název MAS, právní forma.....	6
1.2 Datum podpisu Dohody se SZIF .....	6
1.3 Základní údaje .....	6
<b>2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu .....</b>	<b>8</b>
2.1 Složení SPL .....	8
2.1.1 Přehled cílů, priorit a fichí .....	8
2.1.2 Počet a popis změn SPL .....	11
2.1.1 Počet a popis změn fichí .....	12
2.2 Předpokládaný a skutečný rozpočet .....	12
2.3 Alokace .....	15
2.4 Výzvy.....	15
2.4.1 Výzva č. 1 .....	16
2.4.2 Výzva č. 2 .....	17
2.4.3 Výzva č. 3 .....	19
2.4.4 Výzva č. 4 .....	20
2.4.5 Výzva č. 5 .....	21
2.4.6 Výzva č. 6 .....	22
2.4.7 Výzva č. 7 .....	23
2.4.8 Výzva č. 8 .....	24
2.4.9 Čerpání dotací z výzev SPL z hlediska sektorů.....	25
<b>3. Metodický přístup .....</b>	<b>26</b>
3.1 Pracovní tým.....	26
3.2 Zdroje údajů.....	26
3.3 Monitorovací indikátory .....	28
3.4 Hodnotící otázky.....	29
3.5 Způsob zodpovězení hodnotících otázek.....	30
<b>4. Odpovědi na hodnotící otázky .....</b>	<b>31</b>
<b>5. Závěry a doporučení .....</b>	<b>48</b>
5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů s prioritami a cíli, rovnováha mezi fichemi .....	48
5.2 Míra dosažení cílů .....	49
5.3 Doporučení na základě výsledku ex-post hodnocení SPL.....	50
<b>6. Přílohy .....</b>	<b>51</b>
6.1 Dotazník pro potřeby závěrečné evaluace SPL MAS Sokolovsko.....	51
6.2 Výsledky 8 výzev SPL MAS Sokolovsko schválených SZIF .....	54



## Seznam tabulek

Tabulka 1: Základní údaje o MAS .....	6
Tabulka 2: Seznam obcí na území MAS Sokolovsko .....	6
Tabulka 3: Monitorovací indikátory SPL MAS Sokolovsko .....	11
Tabulka 4: Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet IV.1.2 v jednotlivých fích .....	12
Tabulka 5: Přehled čerpání alokace SPL MAS Sokolovsko .....	15
Tabulka 6: Výzvy SPL MAS Sokolovsko v období let 2009-2014 .....	15
Tabulka 7: Výzva č. 1 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .....	16
Tabulka 8: Výzva č. 1 SPL MAS Sokolovsko - dotace .....	16
Tabulka 9: Výzva č. 2 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .....	17
Tabulka 10: Výzva č. 2 SPL MAS Sokolovsko - dotace .....	18
Tabulka 11: Výzva č. 3 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .....	19
Tabulka 12: Výzva č. 3 SPL MAS Sokolovsko - dotace .....	19
Tabulka 13: Výzva č. 4 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .....	20
Tabulka 14: Výzva č. 4 SPL MAS Sokolovsko - dotace .....	20
Tabulka 15: Výzva č. 5 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .....	21
Tabulka 16: Výzva č. 5 SPL MAS Sokolovsko - dotace .....	21
Tabulka 17: Výzva č. 6 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .....	22
Tabulka 18: Výzva č. 6 SPL MAS Sokolovsko - dotace .....	22
Tabulka 19: Výzva č. 7 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .....	23
Tabulka 20: Výzva č. 7 SPL MAS Sokolovsko - dotace .....	23
Tabulka 21: Výzva č. 8 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .....	24
Tabulka 22: Výzva č. 8 SPL MAS Sokolovsko - dotace .....	24
Tabulka 23: Čerpání alokací SPL z pohledu sektorů (v Kč) .....	25
Tabulka 24: Monitorovací indikátory .....	28



## Seznam grafů

Graf 1: Porovnání předpokládaného a skutečného čerpání rozpočtu v jednotlivých fíchích...	13
Graf 2: Úspěšnost žadatelů o dotaci ve výzvách SPL .....	13
Graf 3: Úspěšnost projektů v jednotlivých výzvách .....	14
Graf 4: Výzva č. 1 .....	17
Graf 5: Výzva č. 2 .....	18
Graf 6: Výzva č. 3 .....	19
Graf 7: Výzva č. 4 .....	20
Graf 8: Výzva č. 5 .....	21
Graf 9: Výzva č. 6 .....	22
Graf 10: Výzva č. 7 .....	23
Graf 11: Výzva č. 8 .....	24
Graf 12: Schválená dotace na projekty v rámci SPL MAS Sokolovsko .....	25
Graf 13: Dopad projektu na zaměstnanost v regionu .....	31
Graf 14: Vliv projektu na zapojení mladých lidí.....	36
Graf 15: Vliv projektu na zapojení žen .....	37
Graf 16: Znalost webu MAS Sokolovsko .....	41
Graf 17: Data na webu MAS Sokolovsko .....	41
Graf 18: Propagace MAS Sokolovsko .....	42
Graf 19: Význam aktivit MAS Sokolovsko .....	42
Graf 20: Zdroj informací o výzvách SPL MAS Sokolovsko .....	43
Graf 21: Zpracování žádosti o dotaci .....	43
Graf 22: Zpracování závěrečného vyúčtování.....	44
Graf 23: Porovnání složitosti administrace projektů přes MAS .....	45
Graf 24: Využívání rad pracovníků MAS při realizaci projektu.....	46
Graf 25: Povinnost hlásit průběh realizace projektu na MAS.....	46
Graf 26: Frekvence podávání hlášení o průběhu realizace projektu na MAS.....	47



## 1. Úvod

Ex-post evaluace představuje následné hodnocení. V našem případě se vztahuje na plnění Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko v období let 2009-2013 (s dopady až do června 2015 s ohledem na pravidlo čerpání n+2).

V úvodu dokumentu jsou k dispozici základní údaje o MAS Sokolovsko. Ve druhé kapitole je obsah zaměřen na kvalitativní analýzu realizace SPL. Věnuje se řešení odchylek plánovaného a skutečného čerpání rozpočtu, rozdělení alokací a rozložení výzev s dopadem na v minulosti uskutečněné aktualizace fichí i samotného Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko.

Ve třetí části jsou řešeny především informace o plnění monitorovacích indikátorů a následně kvalitativní analýza realizace SPL. Ta řešila např. míru přispění SPL k budování místních kapacit ro zaměstnanost a diverzifikaci, míru naplnění cílů místní strategie, rozsah implementace přístupu Leader a dopad metody Leader na místní správu.

Závěr dokumentu posuzuje soulad monitorovacích indikátorů SPL se sledovanými prioritami a cíli SPL, vč. míry jejich naplnění a pokouší se definovat doporučení pro plánování nadcházejícího období EU 2014-2020. Práce tak poskytuje nezbytnou reflexi pro přeformulování nebo celkovou změnu politiky rozvoje území MAS v novém období 2014 - 2020.

Evaluace byla provedena formou analýzy dat získaných z podkladů a údajů o jednotlivých výzvách poskytnutých MAS Sokolovsko o.p.s. Kvantitativní data byla při sběru tříděna do souhrnných kategorií dle jednotlivých výzev, fichí a typu příjemců. Tyto údaje byly analyzovány ve formě tabulek a grafů v programu Microsoft Excel.

Evaluace byla zpracována kombinací externích a interních lidských zdrojů. Na evaluaci se podílel jak tým pracovníků MAS Sokolovsko, tak pracovníci externí společnosti AgAkcent, s.r.o.

Všechny tabulky a grafy použité v tomto dokumentu jsou dílem vlastního zpracování.



### 1.1 Název MAS, právní forma

**Název:** MAS Sokolovsko o.p.s.  
**Právní forma:** obecně prospěšná společnost  
**Statutární zástupce:** Ing. Ivana Jágriková (ředitelka)

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou podpisem dne 26. 1. 2009, která byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni, do oddílu O, vložky 103.

### 1.2 Datum podpisu Dohody se SZIF

**Podpis dohody:** 24. 7.2009

### 1.3 Základní údaje

**Tabulka 1: Základní údaje o MAS**

Rok	Počet obcí	Počet obyvatel MAS	Počet partnerů celkem	z toho veřejný sektor	z toho neveřejný sektor	Rozloha v km <sup>2</sup>
Původní stav (r. 2008)	35	91 823	29	9	20	682,85
Konečný stav (k 30.6.2015)	37	90 086	75	36	39	770,59


Území místní akční skupiny Sokolovsko **prakticky kopíruje hranice okresu Sokolov**, nepatří do něj pouze obce Citice, Těšovice, Tatrovice a Vřesová. Na východě pak uskupení přejímá 3 obce z okresu Karlovy Vary, kterými jsou Hory, Jenišov a Mírová.

**Tabulka 2: Seznam obcí na území MAS Sokolovsko**

Poř. č.	Obec	Poř. č.	Obec	Poř. č.	Obec	Poř. č.	Obec
1.	Březová	12.	Staré Sedlo	23.	Šindelová	34.	Kynšperk nad Ohří
2.	Dolní Rychnov	13.	Šabina	24.	Bukovany	35.	Libavské Údolí
3.	Hory	14.	Vintířov	25.	Dasnice	36.	Rovná
4.	Chodov	15.	Bublava	26.	Chlum Sv. Maří	37.	Nová Ves
5.	Jenišov	16.	Dolní Nivy	27.	Josefov		
6.	Mírová	17.	Jindřichovice	28.	Krajková		
7.	Královské Poříčí	18.	Kraslice	29.	Svatava		
8.	Loket	19.	Oloví	30.	Habartov		
9.	Lomnice	20.	Přebuz	31.	Kaceřov		
10.	Nové Sedlo	21.	Rotava	32.	Horní Slavkov		
11.	Sokolov	22.	Stříbrná	33.	Krásno		



Mapa č. 1: Politická mapa MAS Sokolovsko

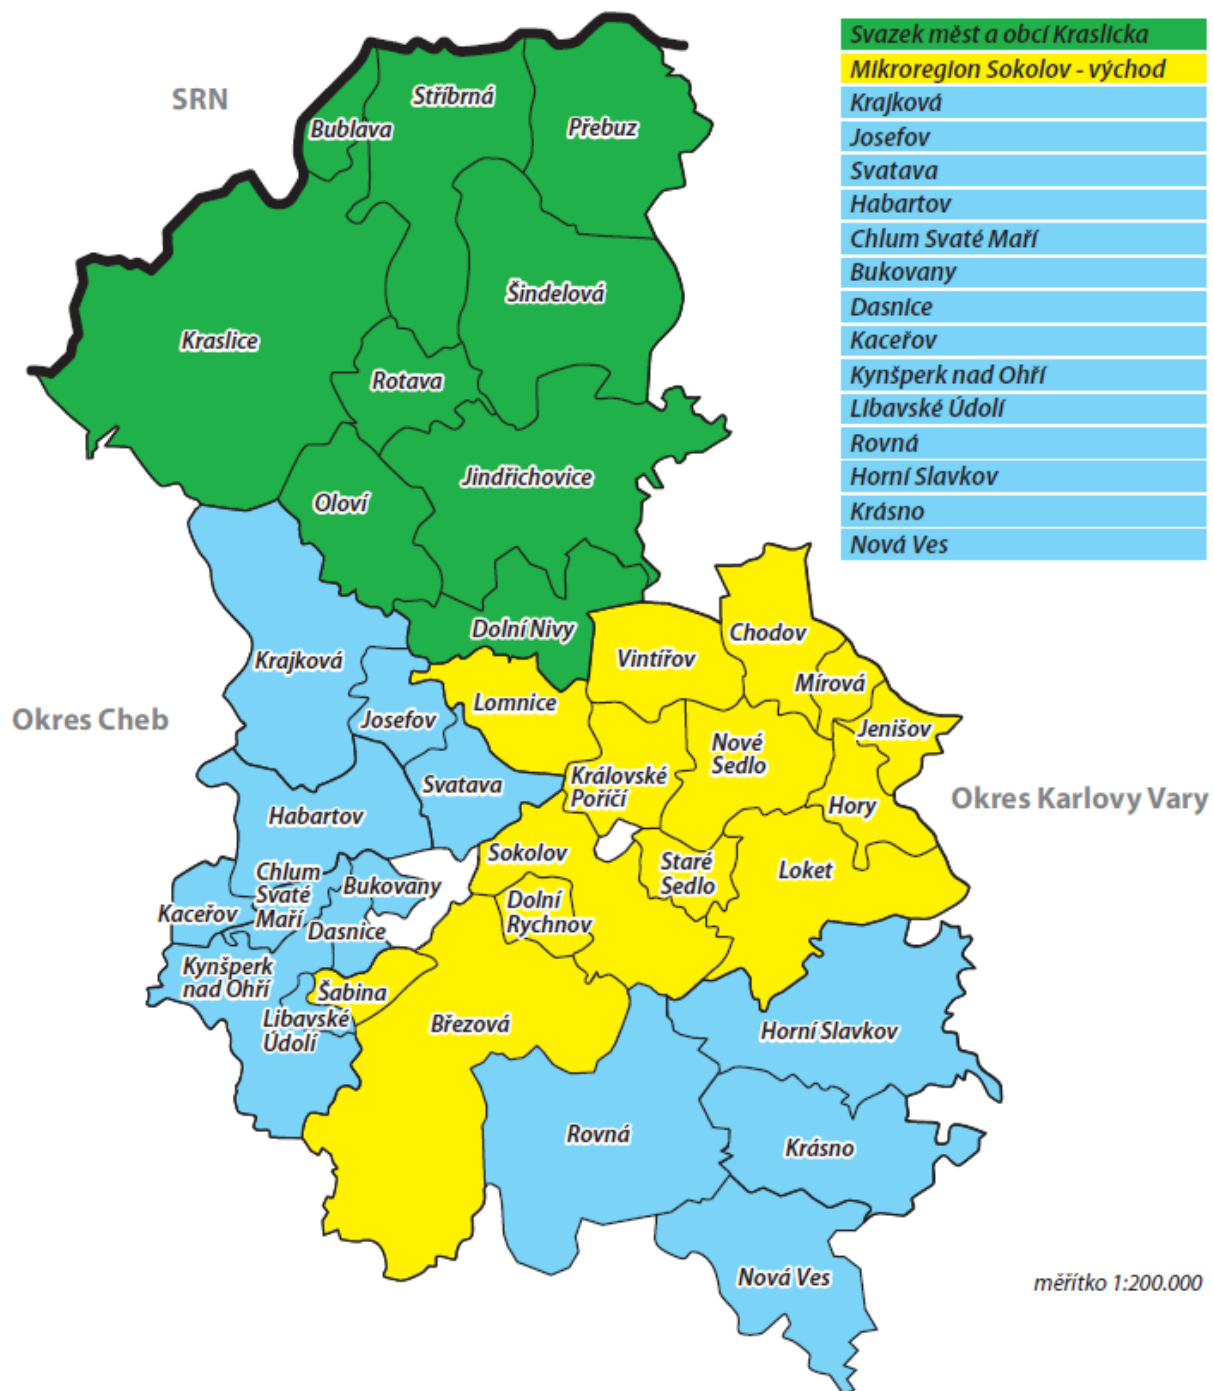



## 2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

### 2.1 Složení SPL

SPL MAS Sokolovsko se plně opírá o svou **Integrovanou strategii rozvoje na období 2007 - 2013 (ISR)**, konkrétně o její analytickou a strategickou část. SPL, přejímá značnou část jejích priorit a opatření. Stejně jako ISR vychází SPL ze specifických potřeb území MAS Sokolovsko. ISR je k dispozici ke stažení na [www.mas-sokolovsko.eu](http://www.mas-sokolovsko.eu).

#### 2.1.1 Přehled cílů, priorit a fichí

### PRIORITA 1. KVALITA ŽIVOTA NA VENKOVĚ

**Cíle:** Zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území MAS Sokolovsko s důrazem na zlepšení základní občanské vybavenosti nezbytné pro spokojený život našich obyvatel. Zvýšení kapacity parkovacích ploch, estetické úrovně veřejných prostranství na území MAS, bezpečnosti na komunikacích prostřednictvím jejich vyšší kvality a lepšího značení. Dále budování vodovodů, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu a zlepšení estetického vzhledu veřejných prostranství v MAS.

**Typové aktivity:** výstavba a úprava parkovacích ploch, parků, klidových zón, náměstí, návší, oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, mostů, lávek, dopravních zastávek, nádraží, veřejného osvětlení, odvodnění ploch, dopravní značení, kanalizace, vodovodní síť, rekonstrukce septiků, ČOV pro veřejnou potřebu, dendrologické a jiné průzkumy a studie, územní plány aj.

**Zahrnuto ve Fiche č. 1 Obnova a rozvoj kvality života na venkově**

- ▶ hlavní opatření PRV III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (nezakládá veřejnou podporu/de minimis)

### PRIORITA 2. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY NA VENKOVĚ

**Cíle:** Vytvoření podmínek vedoucích k nárůstu kvality života na venkově, ke zvyšování atraktivity území pro bydlení, podnikání a cestovní ruch, a to např. pomocí zvýšení míry využití objektů občanské vybavenosti, snížení % nevyužívaných prostor a budov, zlepšení technického stavu objektů a prostor nezbytných pro rozvoj občanské vybavenosti, podpora kulturních, zájmových, vzdělávacích a sportovních organizací, spolků a církve.





**Typové aktivity:** podpora spolků, NNO, rozvoj sportovních a volnočasových aktivit, kulturních akcí místního charakteru, budování občanské vybavenosti – budování, rekonstrukce a vybavení místních budov a objektů, dětská a sportovní hřiště, sociální služby, zdravotnictví.

#### **Zahrnuto ve Fiche č. 2 Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko**

- ▶ hlavní opatření PRV III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (nezakládá veřejnou podporu/de minimis/bloková výjimka)

### **PRIORITA 3. KULTURNÍ DĚDICTVÍ A TRADICE NAŠEHO VENKOVA**

**Cíle:** Péče o veškeré typy památek, zajímavá, jedinečná místa. Snahou je zastavit devastaci kulturního dědictví, zvýšit počet revitalizovaných památek MAS, projekty budování, obnovy a využití objektů kulturního dědictví.

**Typové aktivity:** obnova a údržba kulturního dědictví na území MAS Sokolovsko, programy obnovy a využití památek historických, církevních, technických a lidové architektury, oprava a výstavba památníků a replik památek, výstavy a muzea, aj.

#### **Zahrnuto ve Fiche č. 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova**

- ▶ hlavní opatření PRV III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (nezakládá veřejnou podporu/režim de minimis)

### **PRIORITA 4. CESTOVNÍ RUCH**

**Cíle:** zvýšit počet turistů a jejich spokojenost, podpořit prodloužení délky jejich pobytu na území MAS, zlepšit image regionu Sokolovsko, zkvalitnit a rozšířit nabídku základní infrastruktury a doplňkové infrastruktury pro CR.

**Typové aktivity:** ubytovací a stravovací služby vč. doprovodné infrastruktury – tj. půjčovny sportovního vybavení, objekty a plochy pro sportovně rekreační využití.

#### **Zahrnuto ve Fiche č. 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu**

- ▶ hlavní opatření PRV III.1.3.2 Ubytování, sport (de minimis/bloková výjimka)



## PRIORITA 5. PODNIKÁNÍ

**Cíle:** podpořit růst zaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit na území MAS Sokolovsko.

**Typové aktivity:** budování a rozšiřování provozoven, pořizování strojů a technologií pro fungování mikropodniků, jejich propagace a marketing.

**Zahrnuto ve Fiche č. 5 Rozvoj drobného podnikání**

- ▶ hlavní opatření PRV III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (de minimis/bloková výjimka)

10

## PRIORITA 6. VZDĚLÁVÁNÍ

**Cíle:** zvýšit vzdělání a kvalifikaci hospodářských subjektů v oblastech podporovaných v ose III PRV.

**Typové aktivity:** pořádání odborných exkurzí, realizace vzdělávacích seminářů.

**Zahrnuto ve Fiche č. 6 Vzdělávání a šíření informací na venkově**

- ▶ hlavní opatření PRV III.3.1 Vzdělávání a informace (de minimis)

## PRIORITA 7. VENKOVSKÁ TURISTIKA

**Cíle:** Podpora zpřístupnění zajímavých míst na území MAS.

**Typové aktivity:** budování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek.

**Zahrnuto ve Fiche č. 7 Rozvoj venkovské turistiky**

- ▶ hlavní opatření PRV III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky (nezakládá veřejnou podporu/de minimis/bloková výjimka)



### 2.1.2 Počet a popis změn SPL

V průběhu let 2009-2011 došlo pouze k jedné změně SPL, a to v souvislosti s přistoupením obce Libavské Údolí do MAS Sokolovsko. Druhá změna proběhla v 4/2012 a byla spojena s přistoupením obce Rovná do MAS a s celkovou aktualizací SPL na základě výsledků evaluace vlastního fungování. V 9/2012 bylo nahlášeno vystoupení obce Citice z MAS. V 3/2013 byla SPL změněna z důvodu přistoupení obce Nová Ves do MAS. Všechny ostatní změny SPL se týkaly úprav v důsledku změn v obsazení orgánů MAS.

Ke změně monitorovacích indikátorů došlo pouze 1x, a to v r. 2011. Jedna změna byla spojena s faktem, že přes výzvy MAS Sokolovsko již nadále nebyla podporována modernizace či budování obnovitelných zdrojů energie (OZE). Druhá změna byla spojena se zjištěními plynoucími z evaluace plnění indikátorů v rámci střednědobého hodnocení, kdy bylo zjištěno podhodnocení plánu pro indikátor č. 1 a 4 a naopak nadhodnocení plánu u indikátoru č. 13. Více viz následující tabulka.

11

**Tabulka 3: Monitorovací indikátory SPL MAS Sokolovsko**

Monitorovací indikátor SPL	Plánovaný cílový stav k 31.12.2010	Původní plánovaný cílový stav k 31.12.2013	Změněný plánovaný cílový stav k 31.12.2013
1. Počet realizovaných projektů v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury vč. vodohospodářské	2	6	15
2. Počet projektů plně/částečně zaměřených na zlepšení vzhledu obcí	2	6	6
3. Počet nově vzniklých/aktualizovaných územních plánů obcí	0	1	1
4. Počet nových/zrekonstruovaných budov/ploch sloužících pro zajištění občanské vybavenosti	2	6	15
5. Počet zrekonstruovaných/nově zřízených vzdělávacích center a/nebo počet uskutečněných vzdělávacích projektů	1	4	4
6. Počet obnovených či zhodnocených památkových objektů, ploch, území	3	15	15
7. Počet studií, průzkumů a analýz obnovy či využití, regenerace kulturního dědictví venkova	1	2	2
8. Počet km vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek	3	10	10
9. Počet nových či obnovených expozic a muzeí	0	1	1
10. Počet nových/zrekonstruovaných ubytovacích/stravovacích zařízení sloužících v CR	0	1	1
11. Počet nových/zrekonstruovaných/dovybavených půjčoven sportovního vybavení	1	3	3
12. Počet nových/zrekonstruovaných objektů a ploch sloužících pro sportovně rekreační využití	1	2	2
13. Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených ženami/lidmi do 30 let	1	10	3
14. Počet nových ekonomických subjektů	0	1	1
15. Počet nových či zmodernizovaných zařízení zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE)	0	1	Opatření bylo v r. 2011 zrušeno.



### 2.1.1 Počet a popis změn fichí

Fiche MAS Sokolovsko byly aktualizovány v důsledku změn Pravidel IV.1.1 - Příloha č. 9 – jednalo se pouze o formální úpravy fichí.

Jediná rozsáhlá změna fichí byla provedena v souvislosti s aktualizací SPL v 8-9/2011. Změna spočívala z vyvedení 2 vedlejších opatření (jedno vázané na fichi č. 2 a jedno na fichi č. 3) do samostatných fichí. Z původních 5 fichí tak vzniklo 7 fichí. Nedošlo tím k žádné změně s ohledem na aktivity obecně podporované ze SPL MAS Sokolovsko.

12

### 2.2 Předpokládaný a skutečný rozpočet

Následující tabulka informuje o čerpání rozpočtu Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko v jednotlivých letech/výzvách.


**Tabulka 4: Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet IV.1.2 v jednotlivých fichích**

Fiche	% z rozpočtu (dle platného SPL) PLÁN	% z rozpočtu (stav k 30.6.2015) SKUTEČNOST	Podané žádosti na MAS	
			Ks	Kč
Fiche 1	30 %	34,97 %	48	52 594 006,00
Fiche 2	30 %	37,56 %	57	55 846 578,00
Fiche 3	21 %	9,91 %	24	26 391 468,00
Fiche 4	5 %	3,70 %	7	6 445 302,00
Fiche 5	10 %	8,80 %	19	11 389 290,00
Fiche 6	2 %	0,85 %	3	1 288 139,00
Fiche 7	2 %	4,21 %	3	4 338 000,00
CELKEM	100 %	100,00 %	161	158 292 783,00
Fiche	Schválené žádosti na SZIF		Proplacené projekty	
	Ks	Kč	Ks	Kč
Fiche 1	32	36 073 814,00	32	32 714 639,00
Fiche 2	38	38 741 831,00	36	35 264 269,00
Fiche 3	11	10 225 236,00	10	8 279 307,00
Fiche 4	5	3 816 582,00	3	2 527 236,00
Fiche 5	14	9 078 714,00	11	6 193 661,00
Fiche 6	2	876 639,00	2	829 198,00
Fiche 7	3	4 338 000,00	3	4 303 497,00
CELKEM	104	102 309 381,00	96	89 320 421,00



Odchylka skutečného od plánovaného čerpání rozpočtu bylo u 6 ze 7 fichí v limitu do 10 %. Pouze u fiche č. 3 je rozdíl ve výši 11 %. Tato nadlimitní odchylka byla způsobena menším zájmem z řad žadatelů o tuto fichi. Odchylku skutečnosti od plánu jsme počítali k hodnotám ze sloupce Schválené žádosti na SZIF. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že **plánované čerpání rozpočtu mezi jednotlivé fiche odpovídá skutečnosti.**


**Graf 1: Porovnání předpokládaného a skutečného čerpání rozpočtu v jednotlivých fichích**

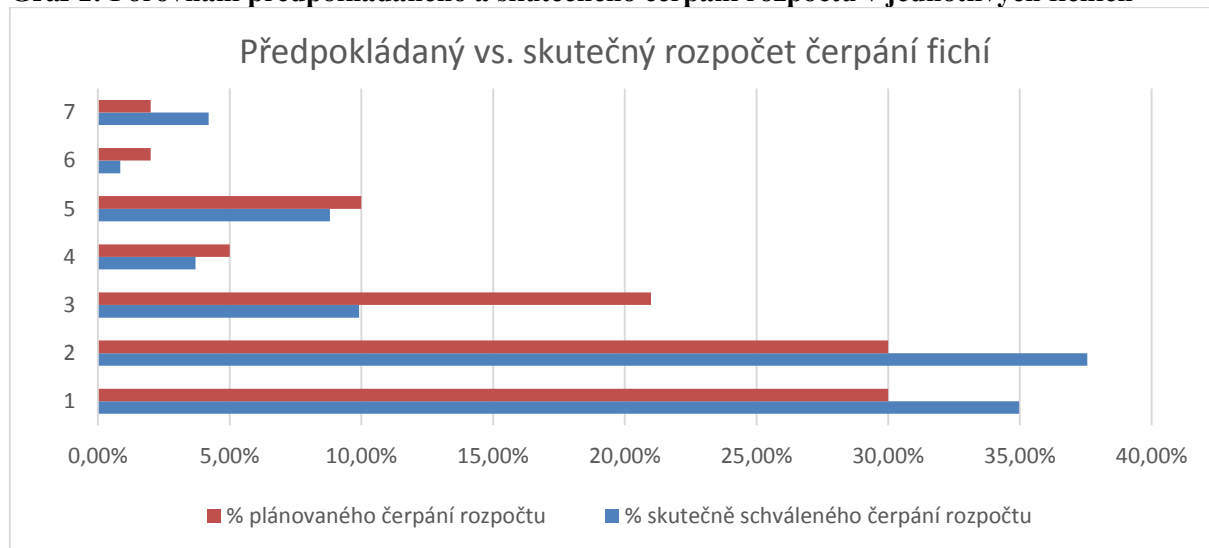

13

Úspěšnost žadatelů o dotaci v souhrnu za všech 8 uskutečněných výzev je velmi vysoká. Svědčí jak o dobré absorpční kapacitě území, tak o kvalitě připravených záměrů a vhodně nastaveném dotačním systému, který podporuje investice do oblastí, o které je zájem.

**Graf 2: Úspěšnost žadatelů o dotaci ve výzvách SPL**

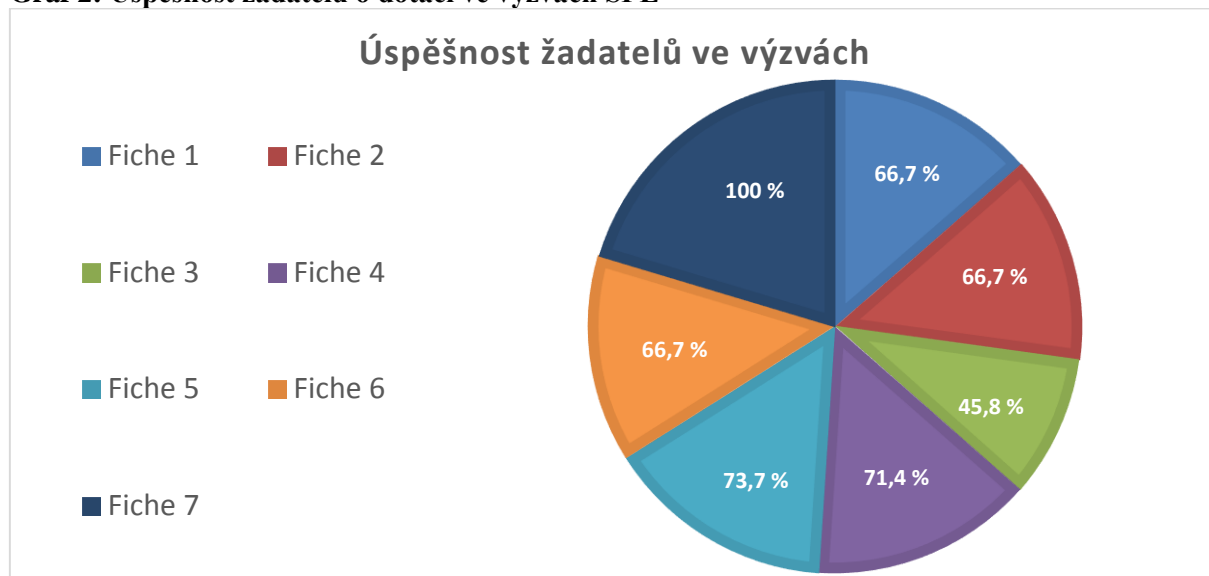

Z údajů uvedených v tabulce č. 4 je patrné, že ze 104 projektů, které MAS a následně i SZIF doporučil k financování, pouze 8 projektů nebylo dotaženo do úspěšného konce.

Ve 2 případech (podnikatelské subjekty z fiche 5 – Dronte s.r.o., Marilyn s.r.o.) se statutární zástupci organizace zapomněli dostavit k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, v důsledku čehož nárok na dotaci zanikl.

Dále byl předčasně ukončen projekt Mikroregionu Sokolov – východ realizovaného ve fichi č. 3, kdy z integrovaného projektu vystoupila část partnerů, což znemožnilo smysluplnou realizaci původní myšlenky.


U 2 podnikatelů došlo k odstoupení od projektu z finančních důvodů – problém s předfinancováním (fiche 4 - p. Fajt, fiche 5 - LaK Centrum, s.r.o.).

Dva žadatelé (fiche 1 – obec Dolní Nivy, fiche 5 – Pavel Makoň) odstoupili od realizace z důvodu změny ve vedení organizace.

Poslední případ odstoupení od projektu byl zdůvodněn neshodami mezi vlastníkem a nájemcem rekonstruované budovy (fiche 2 - žadatel Hasiči sobě o.s.).

**Všech 97 zbývajících projektů bylo úspěšné dokončeno a proplaceno.** Toto je znázorněno v následujícím grafu, kde máme možnost porovnat objem prostředků, o které bylo v rámci výzvách SPL celkem požádáno (modrá barva), vůči objemu financí, které byly MAS a následně SZIFem doporučeny k financování (červená barva) a vůči objemu finančních prostředků, které byly úspěšným žadatelům po realizaci projektu proplaceny (zelená barva).

**Graf 3: Úspěšnost projektů v jednotlivých výzvách**

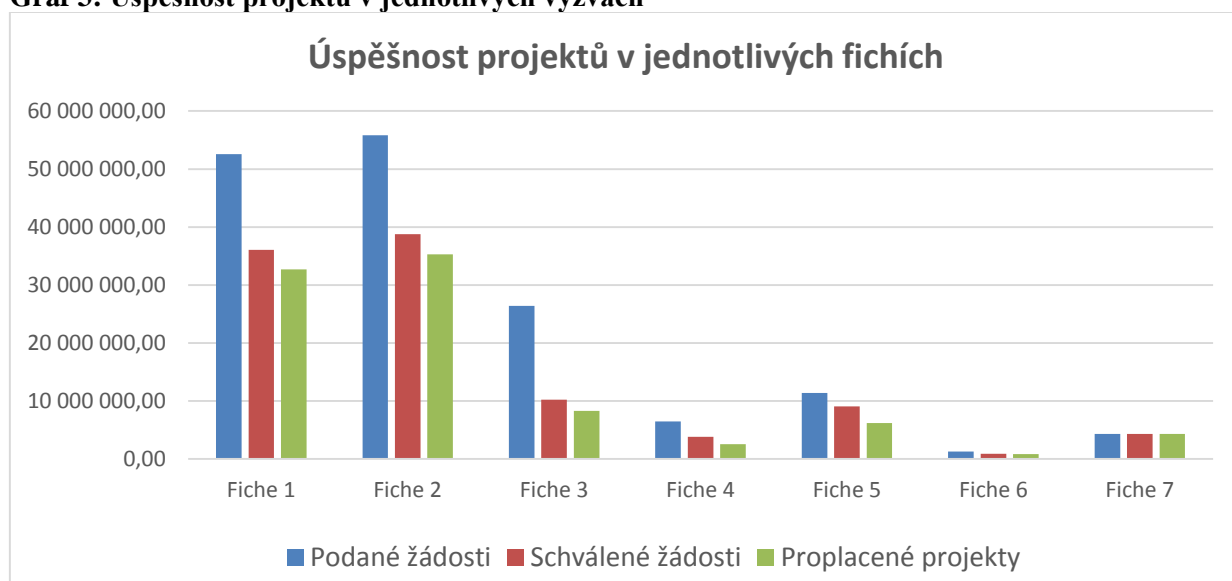

## 2.3 Alokace

**Tabulka 5: Přehled čerpání alokace SPL MAS Sokolovsko**

Rok	Celková alokace (Kč)	Alokováno na opatření V.1.2 (Kč)	Závazkováno na opatření IV.1.2 (Kč)	Proplaceno z opatření IV.1.2 (Kč)
2009	22 311 228,00	21 326 629,00	20 965 867,00	20 535 496,00
2010	22 737 381,00	20 249 935,00	20 236 115,00	16 044 842,00
2011	22 065 000,00	19 565 000,00	23 652 637,00	21 045 522,00
2012	21 836 591,00	19 336 591,00	22 100 950,00	18 983 558,00
2013	15 772 231,00	13 272 231,00	14 180 227,00	11 538 387,00
2014	-	-	2 015 020,00	1 964 002,00
<b>CELKEM</b>	<b>104 722 431,00</b>	<b>91 735 366,00</b>	<b>103 150 816,00</b>	<b>90 111 807,00</b>

Pozn.: Použité údaje jsou platné k 30.6.2015. Částky se vztahují na projekty zaregistrované v daném roce.

Z celkové alokace osy IV. Leader pro MAS Sokolovsko, tj. 104 722 431 Kč, bylo na realizaci projektů v opatření IV.1.2 (projekty) vyplaceno 90 111 807 Kč a 10 721 778,50 Kč bylo nárokováno v rámci opatření IV.1.1 (režie). Nevyužita tak zůstala částka ve výši 3 888 845,50 Kč. Tuto částku tvoří úspory vyvolané výběrovými řízeními v rámci realizace jednotlivých projektů i samotné režie v posledních dvou letech čerpání. V r. 2014 není uvedena žádná alokace, neboť prostředky určené k závazkování tvořily úspory z alokací let předchozích.

Režie na realizaci Strategického plánu tvořila 10,2 % z celkové alokace, přičemž pravidla Programu rozvoje venkova umožňovala režii až do výše 20 % celkové alokace (avšak max. 2,5 mil. Kč/rok). Režie v průměru činila 1 786 963 Kč/rok. Administrativní aparát MAS Sokolovsko lze z hlediska svého působení označit za efektivní a úspěšný.

## 2.4 Výzvy

**Tabulka 6: Výzvy SPL MAS Sokolovsko v období let 2009-2014**

Výzva č.	Kolo SZIF	Zveřejněna od – do	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6	Fiche 7
1	8.	31.8. – 24.9.2009	x	x	x		x		
2	10.	23.4. – 26.5.2010	x	x	x	x	x		
3	11.	6.9. – 30.9.2010			x		x		
4	13.	25.5. – 15.6.2011		x	x				
5	14.	14.9. – 6.10.2011	x			x	x	x	x
6	16.	10.5. – 1.6.2012	x	x	x	x	x	x	x
7	19.	8.4. – 7.5.2013	x	x	x	x	x	x	x
8	20.	15.1. – 6.2.2014		x				x	
<b>Celkem fiche vyhlášena:</b>			<b>5x</b>	<b>6x</b>	<b>6x</b>	<b>4x</b>	<b>6x</b>	<b>4x</b>	<b>3x</b>

Pozn.: Křížky (x) jsou označeny fiche, které byly v dané výzvě vyhlášeny.





### 2.4.1 Výzva č. 1

V první výzvě, která byla vyhlášena dne 31. 8. 2009 a ukončena dne 24. 9. 2009, byly vyhlášeny fiche 1, 2, 3 a 5. Celkem bylo obdrženo 25 žádostí v celkové hodnotě 24 499 314 Kč. Z těchto projektů bylo 23 vybráno k financování, přičemž jejich celková závazková hodnota činila 20 965 867 Kč. Veškeré vybrané projekty byly úspěšně zrealizovány a proplaceny. Celková proplacená dotace těchto projektů činila 20 535 496 Kč.

**Tabulka 7: Výzva č. 1 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů**

Celkem za výzvu č. 1	Počet projektů	Požadovaná dotace (Kč)
Podané žádosti	25	24 499 314,00
Schválené žádosti	23	20 965 867,00
Proplacené žádosti	23	20 535 496,00

16

Následující tabulka podává podrobnější pohled na průběh 1. výzvy. Rozepisuje informace o projektech na úrovni jednotlivých fichí. Fiche 4 nebyla vyhlášena, fiche 6 a 7 v dané době neexistovala, proto jsou jejich hodnoty nulové.

**Tabulka 8: Výzva č. 1 SPL MAS Sokolovsko - dotace**


Číslo fiche	Výše dotace u podaných projektů	Podíl dotace na celku u podaných projektů	Výše dotace u schválených projektů	Podíl dotace na celku u schválených projektů	Výše dotace u proplacených projektů	Podíl dotace na celku u proplacených projektů
Fiche 1	12 141 256,00	49,56 %	10 341 256,00	49,32 %	10 172 317,00	49,54 %
Fiche 2	6 878 423,00	28,08 %	6 878 423,00	32,81 %	6 640 814,00	32,34 %
Fiche 3	4 779 443,00	19,51 %	3 045 996,00	14,53 %	3 022 173,00	14,72 %
Fiche 4	0,00	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Fiche 5	700 192,00	2,86 %	700 192,00	3,34 %	700 192,00	3,41 %
Fiche 6	0,00	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Fiche 7	0,00	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
<b>CELKEM</b>	<b>24 499 314,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>20 965 867,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>20 535 496,00</b>	<b>100,00 %</b>

U první výzvy můžeme sledovat jen velmi malý převis poptávky nad nabídkou. Jednalo se o první výzvu, ke které mnoho subjektů pohlíželo jako na zkušební. Teprve když se prokázala funkčnost systému, vzrostl počet požadovaných projektů více nad možnosti alokace MAS.



V následujícím grafu najdeme výši požadované, schválené a skutečně vyplacené dotace projektů dle jednotlivých fichí. Je jasně patrné, že největší finanční podíl požadované dotace vykazuje Fiche 1 (téměř 50 % alokace dané výzvy). Za celou výzvu došlo k nedočerpání pouze 430 371 Kč alokace.

**Graf 4: Výzva č. 1**

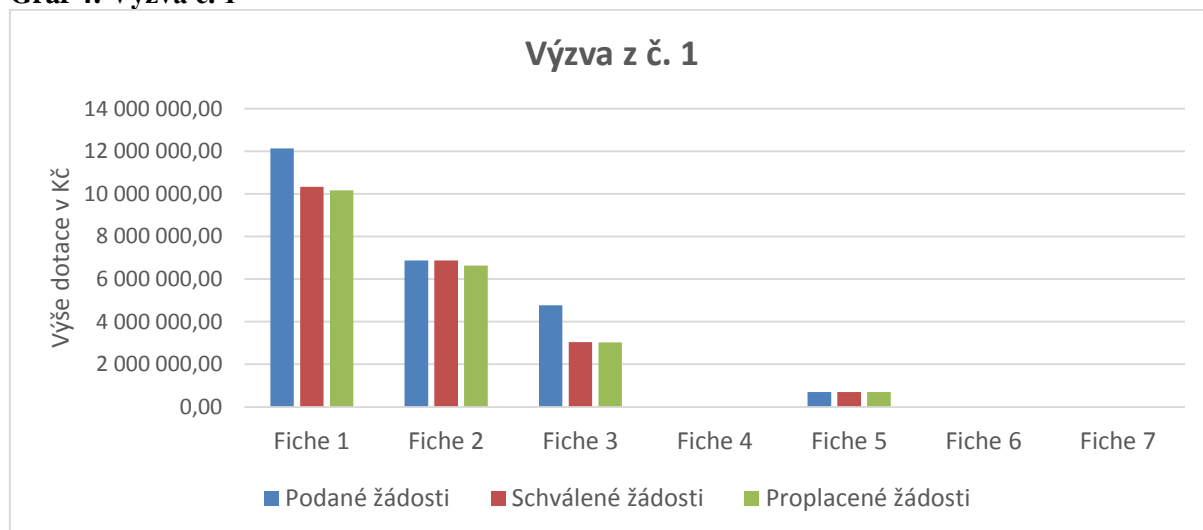

#### 2.4.2 Výzva č. 2

Ve druhé výzvě, která byla vyhlášena dne 23. 4. 2010 a ukončena dne 26. 5. 2010, bylo vyhlášeno všech 5 fichí (fiche 6 a 7 v dané době neexistovaly). Celkem bylo obdrženo 28 žádostí v celkové hodnotě 32 415 755 Kč. Z těchto projektů bylo 18 vybráno k financování, přičemž jejich celková zazávazkovaná hodnota činila 19 060 715 Kč. Z doporučených projektů pouze jeden nebyl realizován. Statutární zástupce žadatele Dronte s.r.o. se opomněl dostavit k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Zbývající vybrané projekty byly úspěšně zrealizovány a proplaceny. Celková proplacená dotace těchto projektů činila 15 076 774 Kč.

**Tabulka 9: Výzva č. 2 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů**

Celkem za výzvu č. 2	Počet projektů	Požadovaná dotace (Kč)
Podané žádosti	28	32 415 755,00
Schválené žádosti	18	19 060 715,00
Proplacené žádosti	17	15 076 774,00

Následující tabulka podává podrobnější pohled na průběh 2. výzvy. Rozepisuje informace o projektech na úroveň jednotlivých fichí. V rámci fiche č. 5 nebyla obdržena žádná žádost o




dotaci. Fiche 6 a 7 nebyly vyhlášeny, neboť v dané době neexistovaly, proto jsou jejich hodnoty nulové.

**Tabulka 10: Výzva č. 2 SPL MAS Sokolovsko - dotace**

Číslo fiche	Výše dotace u podaných projektů	Podíl dotace na celku u podaných projektů	Výše dotace u schválených projektů	Podíl dotace na celku u schválených projektů	Výše dotace u proplacených projektů	Podíl dotace na celku u proplacených projektů
Fiche 1	14 107 732,00	43,52 %	9 731 914,00	51,06%	7 654 016,00	50,70 %
Fiche 2	10 867 148,00	33,52 %	6 061 800,00	31,80%	5 713 641,00	37,85 %
Fiche 3	6 240 875,00	19,25 %	2 332 801,00	12,24%	1 729 117,00	11,45 %
Fiche 4	1 200 000,00	3,70 %	934 200,00	4,90%	nepodepsal smlouvu	0,00 %
Fiche 5	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 6	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 7	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>CELKEM</b>	<b>32 415 755,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19 060 715,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>15 096 774,00</b>	<b>100,00 %</b>

**Graf 5: Výzva č. 2**

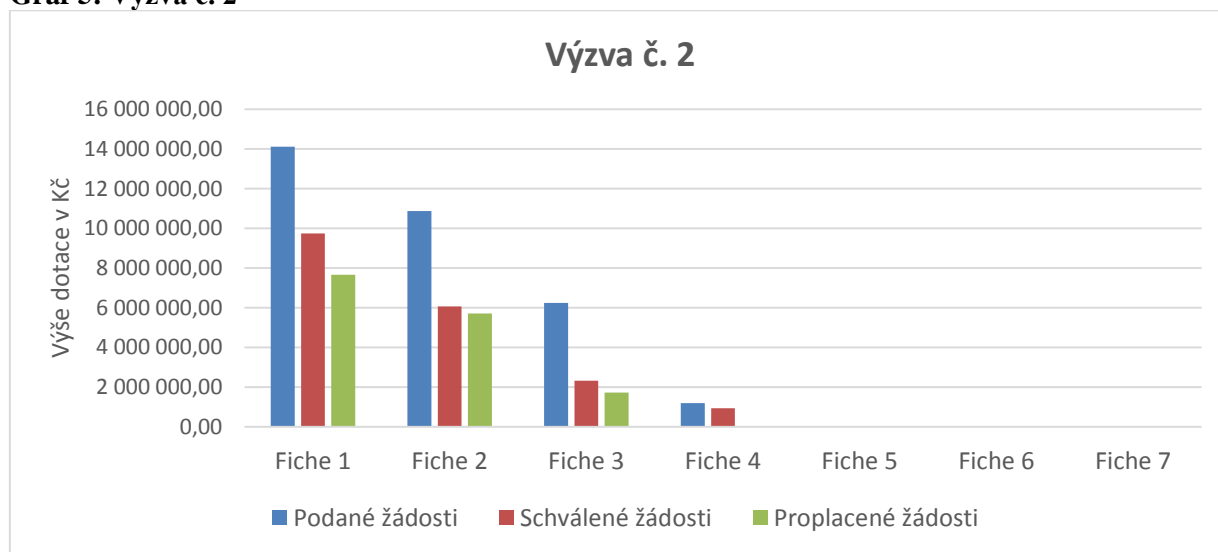

### 2.4.3 Výzva č. 3

Ve třetí výzvě vyhlášené dne 6. 9. 2010 a ukončené dne 30. 9. 2010, byly vyhlášeny fiche 3 a 5. Celkem byly obdrženy 3 žádosti v celkové hodnotě 1 175 400 Kč. Všechny 3 podané žádosti o dotaci byly vybrány k financování, a to v plné výši. Všechny projekty byly úspěšně zrealizovány a proplaceny. Celková proplacená dotace těchto projektů činila 948 068 Kč.

**Tabulka 11: Výzva č. 3 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů**

Celkem za výzvu č. 3	Počet projektů	Požadovaná dotace (Kč)
Podané žádosti	3	1 175 400,00
Schválené žádosti	3	1 175 400,00
Proplacené žádosti	3	948 068,00


19

Dále uvádíme podrobné informace o projektech v jednotlivých fichech. V rámci fiche 3 byla obdržena 1 žádost o dotaci a ve fichi 5 byly obdrženy 2 žádosti. Fiche, 1, 2 a 4 nebyly vyhlášeny. Fiche 6 a 7 taktéž nebyly vyhlášeny, neboť v dané době neexistovaly.

**Tabulka 12: Výzva č. 3 SPL MAS Sokolovsko - dotace**

Číslo fiche	Výše dotace u podaných projektů	Podíl dotace na celku u podaných projektů	Výše dotace u schválených projektů	Podíl dotace na celku u schválených projektů	Výše dotace u proplacených projektů	Podíl dotace na celku u proplacených projektů
Fiche 1	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 2	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 3	382 500,00	32,54 %	382 500,00	32,54 %	382 500,00	40,35 %
Fiche 4	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 5	792 900,00	67,46 %	792 900,00	67,46 %	565 568,00	59,65 %
Fiche 6	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 7	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>CELKEM</b>	<b>1 175 400,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 175 400,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>948 068,00</b>	<b>100,00 %</b>

**Graf 6: Výzva č. 3**

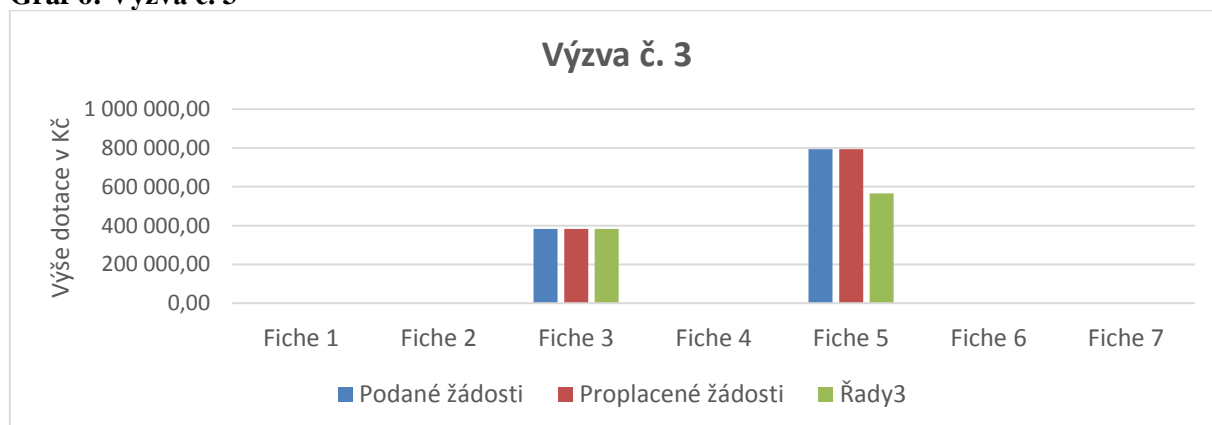

#### 2.4.4 Výzva č. 4

Ve 4. výzvě vyhlášené dne 25. 5. 2011 a ukončené 15. 6. 2011, byly vyhlášeny fiche 2 a 3. Celkem bylo obdrženo 18 žádosti v celkové hodnotě 23 568 110 Kč. Z toho 7 žádostí o dotaci bylo vybráno k financování, a to ve výši 10 816 432 Kč. Všechny projekty byly úspěšně zrealizovány a proplaceny. Celková proplacená dotace těchto projektů činila 10 747 436 Kč.

**Tabulka 13: Výzva č. 4 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů**

Celkem za výzvu č. 4	Počet projektů	Požadovaná dotace (Kč)
Podané žádosti	18	23 568 110,00
Schválené žádosti	7	10 816 432,00
Proplacené žádosti	7	10 747 436,00


20

Dále uvádíme podrobné informace o projektech v jednotlivých fichích. V rámci fiche 3 byla obdržena 1 žádost o dotaci a ve fichi 5 byly obdrženy 2 žádosti. Fiche, 1, 2 a 4 nebyly vyhlášeny. Fiche 6 a 7 taktéž nebyly vyhlášeny, neboť v dané době neexistovaly.

**Tabulka 14: Výzva č. 4 SPL MAS Sokolovsko - dotace**

Číslo fiche	Výše dotace u podaných projektů	Podíl dotace na celku u podaných projektů	Výše dotace u schválených projektů	Podíl dotace na celku u schválených projektů	Výše dotace u proplacených projektů	Podíl dotace na celku u proplacených projektů
Fiche 1	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 2	15 102 696,00	64,08 %	9 016 432,00	83,36 %	9 005 486,00	83,79 %
Fiche 3	8 465 414,00	35,92 %	1 800 000,00	16,64 %	1 741 950,00	16,21 %
Fiche 4	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 5	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 6	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 7	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>CELKEM</b>	<b>23 568 110,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10 816 432,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10 747 436,00</b>	<b>100,00 %</b>

**Graf 7: Výzva č. 4**

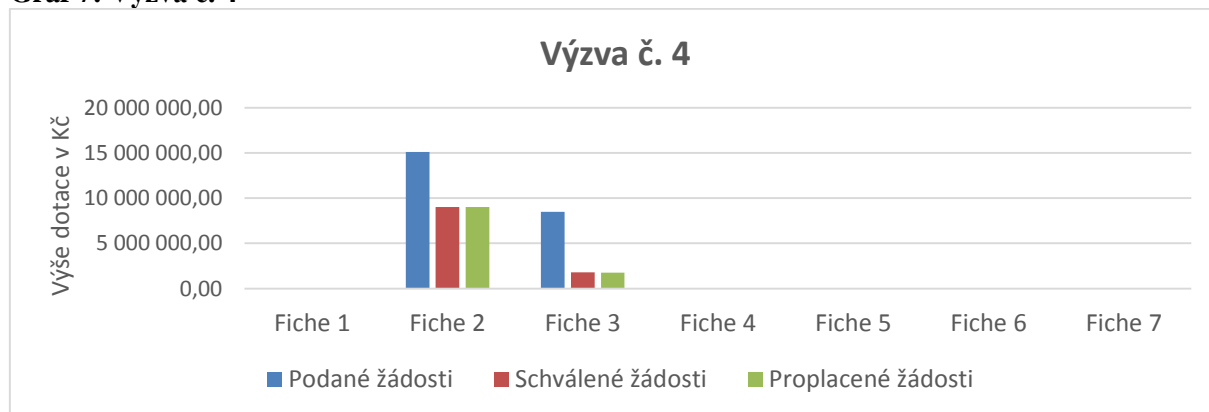

### 2.4.5 Výzva č. 5

V 5. výzvě vyhlášené dne 14. 9. 2011 a ukončené 6. 10. 2011, byly vyhlášeny fiche 1, 4, 5, 6 a 7. Celkem bylo obdrženo 16 žádostí v hodnotě 16 634 068 Kč. Z toho 13 bylo vybráno k financování, přičemž celková zazávazkovaná částka činila 12 836 205 Kč. Z těchto 13 projektů bylo dokončeno a proplaceno 10. Celková proplacená dotace činila 10 298 086 Kč.

**Tabulka 15: Výzva č. 5 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů**

Celkem za výzvu č. 5	Počet projektů	Požadovaná dotace (Kč)
Podané žádosti	16	16 634 068,00
Schválené žádosti	13	12 836 205,00
Proplacené žádosti	10	10 298 086,00


21

V rámci 5. výzvy 3 vybrané projekty nebyly zrealizovány. V jednom případě se příjemce opomněl dostavit k podpis Dohody o poskytnutí dotace. Zbylé dva příklady tvořili podnikatelé, u nichž vznikly v průběhu realizace potíže s předfinancováním, a proto od projektu sami odstoupili.

**Tabulka 16: Výzva č. 5 SPL MAS Sokolovsko - dotace**

Číslo fiche	Výše dotace u podaných projektů	Podíl dotace na celku u podaných projektů	Výše dotace u schválených projektů	Podíl dotace na celku u schválených projektů	Výše dotace u proplacených projektů	Podíl dotace na celku u proplacených projektů
Fiche 1	12 249 034,00	73,64%	8 614 352,00	67,11%	7 788 737,00	75,63%
Fiche 2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fiche 3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fiche 4	288 341,00	1,73%	288 341,00	2,25%	ukončil projekt	0,00%
Fiche 5	3 358 693,00	20,19%	3 195 512,00	24,89%	1 805 852,00	17,54%
Fiche 6	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fiche 7	738 000,00	4,44%	738 000,00	5,75%	703 497,00	6,83%
<b>CELKEM</b>	<b>16 634 068,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 836 205,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 298 086,00</b>	<b>100,00%</b>

**Graf 8: Výzva č. 5**

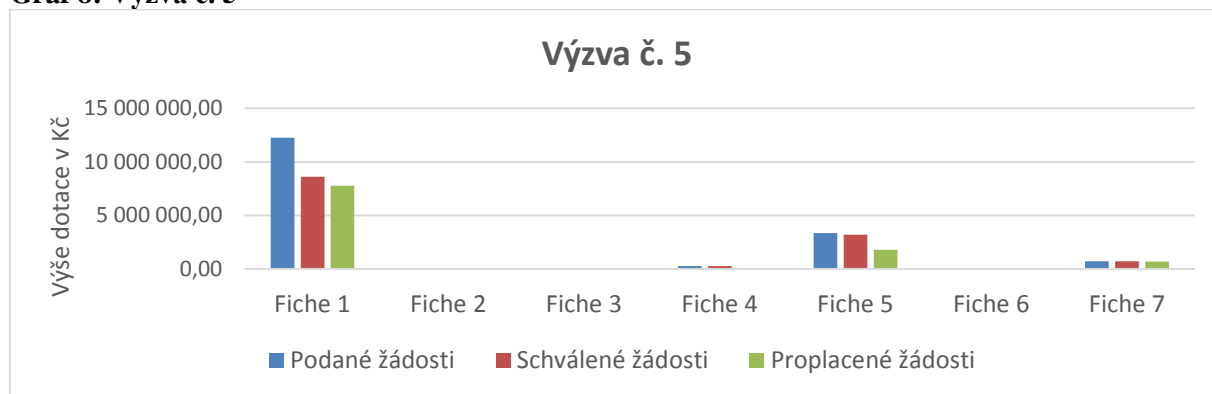

### 2.4.6 Výzva č. 6

V 6. výzvě vyhlášené dne 10. 5. 2012 a ukončené 1. 6. 2012, bylo vyhlášeno všech 7 fichí. Celkem bylo obdrženo 33 žádostí v hodnotě 31 178 896 Kč. Z toho 19 bylo vybráno k financování, přičemž celková zazávazkovaná částka činila 22 100 950 Kč. Z těchto 19 projektů bylo dokončeno a proplaceno 17. Celková proplacená dotace činila 18 983 558 Kč.

**Tabulka 17: Výzva č. 6 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů**

Celkem za výzvu č. 6	Počet projektů	Požadovaná dotace (Kč)
Podané žádosti	33	31 178 896,00
Schválené žádosti	19	22 100 950,00
Proplacené žádosti	17	18 983 558,00


22

V rámci 6. výzvy 2 vybrané projekty nebyly zrealizovány. V jednom případě žadatel odstoupil od projektu (změna v zastupitelstvu obce vedla ke změně názoru na potřebnost projektu). Ve druhém případě došlo k rozkolům mezi žadatelem (nájemcem) a pronajímatelem, které vedly k nemožnosti projekt smysluplně dokončit.

**Tabulka 18: Výzva č. 6 SPL MAS Sokolovsko - dotace**

Číslo fiche	Výše dotace u podaných projektů	Podíl dotace na celku u podaných projektů	Výše dotace u schválených projektů	Podíl dotace na celku u schválených projektů	Výše dotace u proplacených projektů	Podíl dotace na celku u proplacených projektů
Fiche 1	10 006 298,00	32,09 %	5 143 492,00	23,27 %	4 856 769,00	25,58 %
Fiche 2	11 130 059,00	35,70 %	11 213 272,00	50,74 %	8 442 220,00	44,47 %
Fiche 3	2 592 038,00	8,31 %	792 038,00	3,58 %	792 038,00	4,17 %
Fiche 4	2 379 430,00	7,63 %	1 199 418,00	5,43 %	1 199 418,00	6,32 %
Fiche 5	2 334 571,00	7,49 %	1 427 730,00	6,46 %	1 376 919,00	7,25 %
Fiche 6	936 500,00	3,00 %	525 000,00	2,38 %	516 194,00	2,72 %
Fiche 7	1 800 000,00	5,77 %	1 800 000,00	8,14 %	1 800 000,00	9,48 %
<b>CELKEM</b>	<b>31 178 896,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>22 100 950,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>18 983 558,00</b>	<b>100,00 %</b>

**Graf 9: Výzva č. 6**

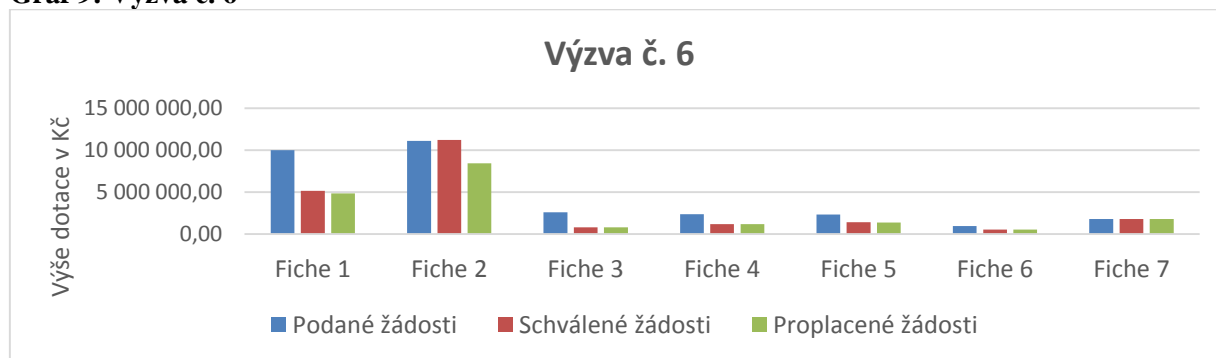



### 2.4.7 Výzva č. 7

V 7. výzvě vyhlášené dne 8. 4. 2013 a ukončené 7. 5. 2013, bylo vyhlášeno všech 7 fichí. Celkem bylo obdrženo 29 žádostí v hodnotě 26 816 220 Kč. Z toho 13 bylo vybráno k financování, přičemž celková zazávazkovaná částka činila 14 180 227 Kč. Z těchto 13 projektů bylo dokončeno a proplaceno 11. Celková proplacená dotace činila 11 538 387 Kč.

**Tabulka 19: Výzva č. 7 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů**

Celkem za výzvu č. 7	Počet projektů	Požadovaná dotace (Kč)
Podané žádosti	29	26 816 220,00
Schválené žádosti	13	14 180 227,00
Proplacené žádosti	11	11 538 387,00


23

V rámci 7. výzvy 2 vybrané projekty nebyly zrealizovány. V jednom případě žadatel odstoupil od projektu (jednalo se o integrovaný projekt, z něhož část partnerů odstoupila). Ve druhém případě došlo ke změně ve vedení organizace, které myšlenku projektu nepovažovalo za prioritní. Do fiche 6 nebyl předložen žádný projektový záměr.

**Tabulka 20: Výzva č. 7 SPL MAS Sokolovsko - dotace**

Číslo fiche	Výše dotace u podaných projektů	Podíl dotace na celku u podaných projektů	Výše dotace u schválených projektů	Podíl dotace na celku u schválených projektů	Výše dotace u proplacených projektů	Podíl dotace na celku u proplacených projektů
Fiche 1	4 089 686,00	15,25%	2 242 800,00	15,82%	2 242 800,00	19,44%
Fiche 2	10 204 871,00	38,05%	3 908 523,00	27,56%	3 811 110,00	33,03%
Fiche 3	3 931 198,00	14,66%	1 871 901,00	13,20%	611 529,00	5,30%
Fiche 4	2 577 531,00	9,61%	1 394 623,00	9,83%	1 327 818,00	11,51%
Fiche 5	4 212 934,00	15,71%	2 962 380,00	20,89%	1 745 130,00	15,12%
Fiche 6	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fiche 7	1 800 000,00	6,71%	1 800 000,00	12,69%	1 800 000,00	15,60%
<b>CELKEM</b>	<b>26 816 220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 180 227,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 538 387,00</b>	<b>100,00%</b>

**Graf 10: Výzva č. 7**

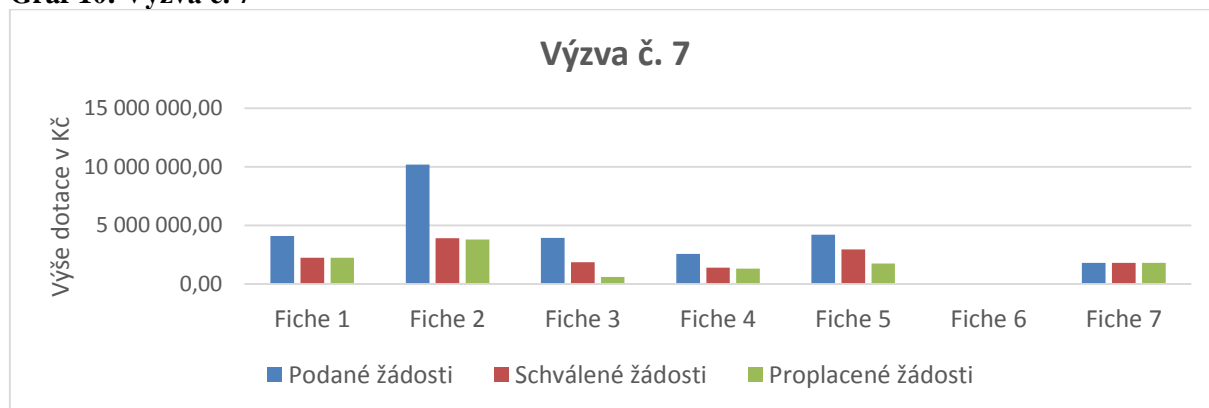

### 2.4.8 Výzva č. 8

V 8. výzvě vyhlášené dne 15. 1. 2014 a ukončené 6. 2. 2014, byly s ohledem na poměrně malou alokaci vyhlášeny pouze fiche 2 a 6. Bylo obdrženo 9 žádostí v hodnotě 2 015 020 Kč. Všechny byly vybrány k financování, přičemž celková zazávazkovaná částka činila 2 015 020 Kč. Všechny tyto projekty byly úspěšně dokončeny a proplaceny. Celková proplacená dotace činila 1 964 002 Kč.

**Tabulka 21: Výzva č. 8 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů**

Celkem za výzvu č. 8	Počet projektů	Požadovaná dotace (Kč)
Podané žádosti	9	2 015 020,00
Schválené žádosti	9	2 015 020,00
Proplacené žádosti	9	1 964 002,00


24

V této závěrečné výzvě byla poprvé omezena velikost způsobilých výdajů ze 2 mil. Kč na 250 tis. Kč. Cílem bylo podpořit menší projekty s rychlou realizací (bez výběrových řízení).

**Tabulka 22: Výzva č. 8 SPL MAS Sokolovsko - dotace**

Číslo fiche	Výše dotace u podaných projektů	Podíl dotace na celku u podaných projektů	Výše dotace u schválených projektů	Podíl dotace na celku u schválených projektů	Výše dotace u proplacených projektů	Podíl dotace na celku u proplacených projektů
Fiche 1	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 2	1 663 381,00	82,55 %	1 663 381,00	82,55 %	1 650 998,00	84,06 %
Fiche 3	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 4	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 5	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Fiche 6	351 639,00	17,45 %	351 639,00	17,45 %	313 004,00	15,94 %
Fiche 7	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>CELKEM</b>	<b>2 015 020,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2 015 020,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 964 002,00</b>	<b>100,00 %</b>

**Graf 11: Výzva č. 8**

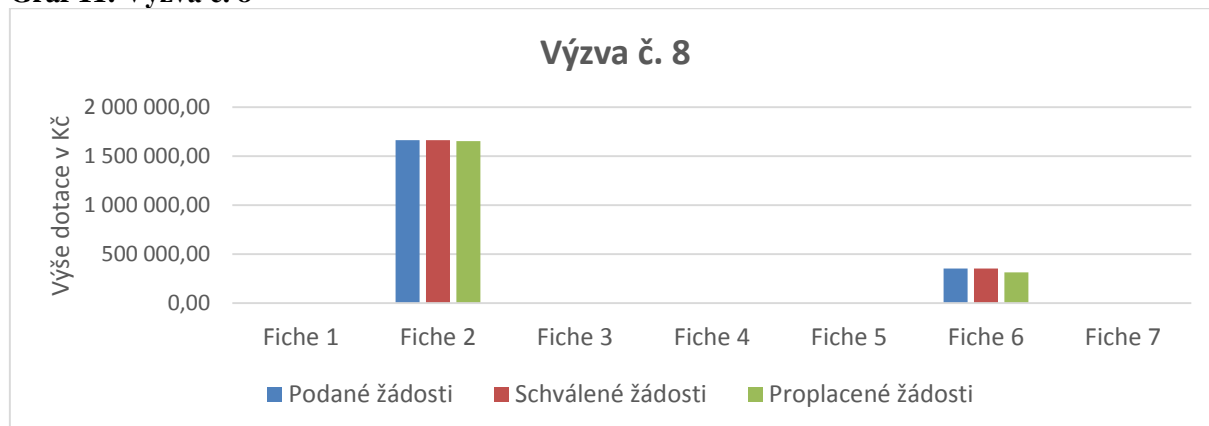

### 2.4.9 Čerpání dotací z výzev SPL z hlediska sektorů

Cílem MAS Sokolovsko bylo podpořit všechny 3 sektory zapojené do fungování MAS, tj. sektor veřejný, podnikatelský a neziskový.

Fiche 1 a 2 byly v podstatě určeny jen pro veřejný sektor. Naopak fiche 4, 5 a 6 byly směřovány na podnikatelské subjekty. Do fichí 3 a 7 se předpokládalo zapojení především neziskového sektoru.


**Tabulka 23: Čerpání alokací SPL z pohledu sektorů (v Kč)**

Výzva č.	Schválená dotace od SZIF celkem	Veřejný sektor	NNO vč. příspěvkových organizací	Podnikatelé
1	20 965 867,00	18 109 876,00	2 155 799,00	700 192,00
2	19 060 715,00	16 387 591,00	1 738 924,00	934 200,00
3	1 175 400,00	382 500,00	0,00	792 900,00
4	10 816 432,00	8 019 485,00	2 796 947,00	0,00
5	12 836 205,00	9 352 352,00	0,00	3 483 853,00
6	22 100 950,00	13 549 284,00	4 124 518,00	4 427 148,00
7	14 180 227,00	8 553 172,00	1 270 052,00	4 357 003,00
8	2 015 020,00	643 006,00	1 372 014,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>103 150 816,00</b>	<b>74 997 266,00</b>	<b>13 458 254,00</b>	<b>14 695 296,00</b>

25

Z celkového objemu více než 103 mil. Kč, které byly SZIFem na projekty schválené ve výzvách MAS Sokolovsko, bylo určeno **72,7 % na projekty podané veřejným sektorem**, **13 % na projekty neziskového sektoru** (s ohledem na obsah projektů započítáváme zde i příspěvkové organizace obcí) a **14,3 % na projekty podnikatelů**.

**Graf 12: Schválená dotace na projekty v rámci SPL MAS Sokolovsko**

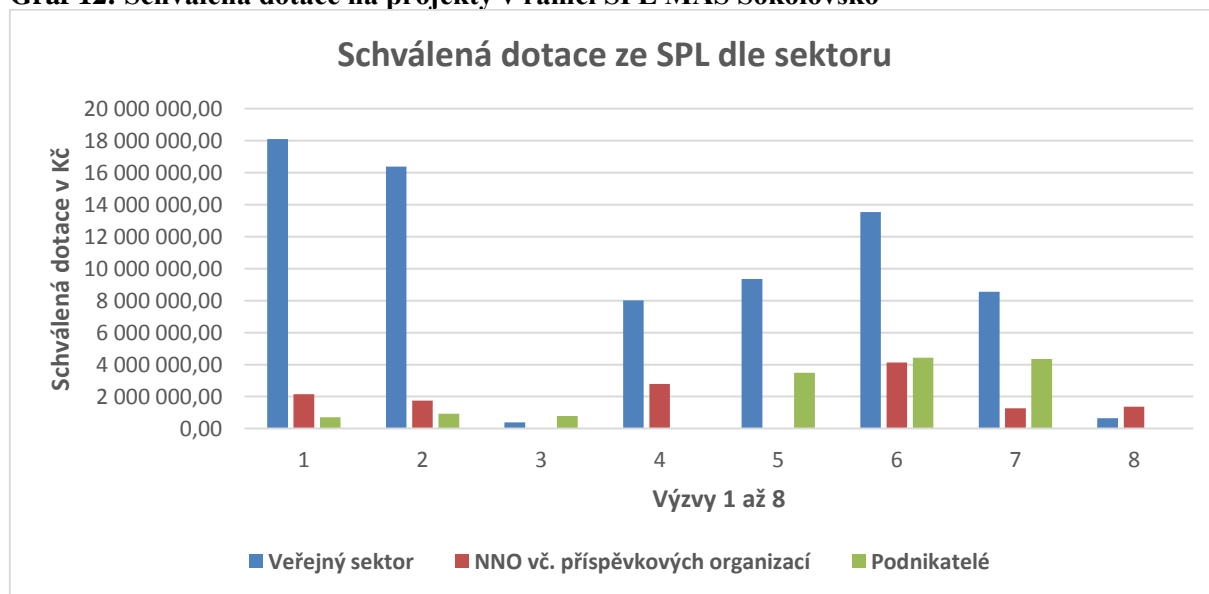

### 3. Metodický přístup

#### 3.1 Pracovní tým

Pro tvorbu ex-post evaluace Strategického plánu Leader byla zvolena **kombinace interních a externích lidských zdrojů**.

Za MAS Sokolovsko se na tvorbě hodnocení podílela Ing. Ivana Jágriková, statutární zástupce organizace a současně projektová manažerka SPL, která byla přítomna u vyhlášení a realizace všech výzev SPL MAS Sokolovsko. Její informace tak poskytly perfektní vhled do průběhu celého šestiletého procesu realizace SPL.

Za externího zpracovatele byla zvolena organizace AgAkcent, s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 2. 1997 oddíl C vložka 8441, IČ: 25207261, se sídlem Zlatnická 195, 339 01 Klatovy. Hlavní kontaktní osoba organizace pro tvorbu evaluace SPL byl pan Vlastimil Hálek.

#### 3.2 Zdroje údajů

Pro zpracování ex post evaluace SPL MAS Sokolovsko byly využity následující zdroje dat:

##### **Data z monitorovacích šetření na místě**

U všech projektů realizovaných v rámci SPL MAS Sokolovsko došlo min. k 1 z následujících kontrol – ex ante (tj. před schválením výběrovou komisí), interim (v průběhu realizace projektu), ex post (tj. po ukončení projektu v době udržitelnosti). Výsledkem monitoringu jsou podrobné informace o potížích, se kterými se žadatelé/příjemci dostali do styku, jak na ně reagovali, jaké na nich tyto potíže zanechaly stoly (např. zájem znovu ne/žádat o dotaci).

##### **Dotazníkové šetření**

V rámci provádění střednědobé evaluace činnosti MAS v r. 2011 bylo provedeno dotazníkové šetření mezi žadateli z prvních 4 výzev SPL MAS Sokolovsko (tj. výzvy uskutečněné do termínu 30.6.2011). Celkem bylo osloveno 40 žadatelů (úspěšných i neúspěšných). Ačkoli měli dotázaní pouze jeden týden na vyplnění a navrácení dotazníků, obdrželi jsme 17 vyplněných dotazníků od úspěšných žadatelů a 2 od žadatelů neúspěšných, což představuje 47,5% návratnost.



Proto, abychom mohli srovnat první a druhou polovinu sledovaného období, použili jsme i pro závěrečné hodnocení SPL stejný dotazník. Ten byl rozeslán na žadatele ze zbylých 4 výzev. Celkem bylo tedy osloveno 46 subjektů (některé podaly více žádostí v rámci těchto 4 výzev). Z nich odpovědělo 24 žadatelů (z toho 1 neúspěšný). Návratnost tak tvoří 50 %, což je o 2,5 % více než v rámci střednědobého hodnocení.

Vzor dotazníku je součástí příloh této evaluace. V úvodu je dotazovaný informován o důvodu provádění dotazování, o způsobu vyplnění a navrácení dotazníku. Pro závěrečné dotazníkové šetření byla použita forma elektronická – tzv. google dotazník. Samotný dotazník pak obsahuje 20 otázek rozdělených do dvou bloků, přičemž první část je věnována dotovaným projektům a druhá část propagaci a další činnosti MAS.

### Osobní rozhovory

Pracovníci MAS byli požádáni, aby se v období 6-12/2014 při každém setkání se žadatelem, starostou, členy, partnery či dalšími aktéry v oblasti fungování metody Leader, dotazovali na spokojenost s činností naší místní akční skupiny, na návrhy jak naše působení zlepšit, zviditelnit apod.

Díky poměrně dlouhému časovému úseku vymezenému na provádění osobních rozhovorů na téma hodnocení působení MAS Sokolovsko, jsme získali poměrně podrobný přehled o názorech většiny stakeholderů, kteří s námi spolupracují.

### Konzultace a semináře

MAS Sokolovsko průběžně poskytuje konzultace všem zájemcům, kteří o ně projeví zájem. Konzultace probíhají buď osobně v kanceláři MAS či v prostorách konzultující osoby, využíván je také skype, e-mailová korespondence a telefonické rozhovory.

Především při vyhlášení výzvy MAS organizuje semináře pro potenciální žadatele. Zde je vždy prostor pro dotazy, diskuse a návrhy na zlepšení činnosti MAS.



### 3.3 Monitorovací indikátory

**Tabulka 24: Monitorovací indikátory**

Monitorovací indikátor SPL	Plánovaná hodnota dle původního SPL k 31.12.2013	Plánovaná hodnota dle platného SPL k 31.12.2013	Dosažené hodnoty k 30.6.2015	% dosažení cílové hodnoty
1. Počet realizovaných projektů v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury vč. vodohospodářské	6	15	22	147 %
2. Počet projektů plně/částečně zaměřených na zlepšení vzhledu obcí	6	6	9	150 %
3. Počet nově vzniklých/aktualizovaných územních plánů obcí	1	1	0	0 %
4. Počet nových/zrekonstruovaných budov/ploch sloužících pro zajištění občanské vybavenosti	6	15	24	160 %
5. Počet zrekonstruovaných/nově zřízených vzdělávacích center a/nebo počet uskutečněných vzdělávacích projektů	4	4	4	100 %
6. Počet obnovených či zhodnocených památkových objektů, ploch, území	15	15	9	60%
7. Počet studií, průzkumů a analýz obnovy či využití, regenerace kulturního dědictví venkova	2	2	7	350 %
8. Počet km vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek	10	10	0,186	1,86 %
9. Počet nových či obnovených expozic a muzeí	1	1	3	300 %
10. Počet nových/zrekonstruovaných ubytovacích/stravovacích zařízení sloužících v CR	1	1	1	100 %
11. Počet nových/zrekonstruovaných/dovybavených půjčoven sportovního vybavení	3	3	1	33 %
12. Počet nových/zrekonstruovaných objektů a ploch sloužících pro sportovní rekreaci využití	2	2	9	450 %
13. Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených ženami/lidmi do 30 let	10	3	12	400 %
14. Počet nových ekonomických subjektů	1	1	1	100 %
15. Počet nových či zmodernizovaných zařízení zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE)	1	Opatření v r. 2011 zrušeno.	/	/
<b>Celkem průměrné plnění MI</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>168 %</b>

Z celkem 14 sledovaných monitorovacích indikátorů byly přesně na 100 % naplněny 3. Ze zbývajících 11 indikátorů bylo 7 přesazeno a 4 nebyly kompletně naplněny. Jednalo se především o indikátory vázané na projekty, které byly podporovány i z jiných dotačních titulů. V našem případě z česko-saské a česko-bavorské spolupráce (indikátor počet km vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek), z programu IOP a příspěvku Karlovarského kraje (počet nově vzniklých/aktualizovaných územních plánů obcí), z havarijního programu (počet obnovených památkových objektů, ploch, území). O projekty typu půjčovny sportovního vybavení byl velmi malý zájem (byly obdrženy pouze 2 žádosti o dotaci a obě byly podpořeny - 1 projekt bohužel nebyl dotažen do úspěšného konce, proto MI č. 11 byl naplněn pouze z 33 %). **Celkový výsledek plnění indikátorů však považujeme za více než uspokojivý, neboť v průměru byly indikátory naplněny na 168 %.**



### 3.4 Hodnotící otázky

#### Povinné hodnotící otázky

Tyto otázky byly stanoveny Ministerstvem zemědělství ČR a odvolávají se především na základní principy iniciativy Leader a preferenční kritéria hodnocení projektů. Dále si každá MAS mohla v rámci ex-post hodnocení zvolit dodatečné vlastní hodnotící otázky.

#### A) Do jaké míry napomohla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?

- Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
- Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
- Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci?

29

#### B) Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?

Mezi klíčové ukazatele sledované při závěrečném hodnocení řadíme plnění priorit SPL MAS Sokolovsko. Ptáme se tedy, nakolik **byly naplněny následující priority**:

- Priorita 1. Kvalita života na venkově
- Priorita 2. Občanská vybavenost a služby na venkově
- Priorita 3. Kulturní dědictví a tradice našeho venkova
- Priorita 4. Cestovní ruch
- Priorita 5. Podnikání
- Priorita 6. Vzdělávání
- Priorita 7. Venkovská turistika

#### C) Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?

- Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (mladí lidé/ženy)?
- Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?
- Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?
- Jak napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů?
- Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
- Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?





**D) Do jaké míry přispěla implementace přístupu Leader ke zlepšení místní správy?**

- Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za účelem animace, resp. propagace SPL, podpora potenciálních příjemců apod.)

**Dobrovolné hodnotící otázky**

- Jak jste zpracovali žádost o dotaci?
- Jak jste zpracovali žádost o proplacení a závěrečné vyúčtování dotace?
- Považujete administraci projektu přes MAS Sokolovsko oproti žádostem podávaným přímo do Programu rozvoje venkova nebo jiných programů za složitější?
- Využívali jste během realizace projektu podpořeného v rámci SPL MAS Sokolovsko rad pracovníků MAS?
- Považujete za přínosné, aby byl příjemce povinen hlásit průběh realizace projektu pracovníkům MAS, a pokud ano, jak často?

30

**3.5 Způsob zodpovězení hodnotících otázek**

Na základě Integrované strategie území MAS potažmo SPL, byly definovány základní ukazatele, které jsou pro MAS Sokolovsko specifické:

- Rozvoj venkovských oblastí na území MAS Sokolovsko v oblasti dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti a vzdělávání obyvatel MAS.
- Obnova kulturního dědictví.
- Rozvoj podnikání na venkově.
- Cestovní ruch a venkovská turistika.

Informace, které jsou použity v hodnocení, vychází především z dat evidovaných v sekretariátu MAS Sokolovské (získané především v rámci střednědobého hodnocení a monitoringu projektů). Zodpovězení otázek bylo umožněno také díky 2 dotazníkovým šetřením uskutečněným v rámci provádění evaluací SPL a z rozhovorů s žadateli a příjemci dotace.



## 4. Odpovědi na hodnotící otázky

### Povinné hodnotící otázky

Ve snaze vést žadatele k tvorbě projektů, které by napomáhaly rozvoji a řešení těchto 4 oblastí, naše MAS výrazně bodově podporovala jejich plnění při hodnocení předkládaných projektů.

#### A) Do jaké míry napomohla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?


##### • Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?

Vytváření pracovních příležitostí je jednou z našich priorit. V rámci monitorovacích indikátorů bylo plánováno vytvoření 10 nových pracovních míst. Tento indikátor byl naplněn na úroveň **12 nových pracovních míst** (plné pracovní úvazky) s min. pětiletou udržitelností!

Skutečnost však je ještě pozitivnější. Z osobních rozhovorů a z dotazníkových šetření vyplynulo, že vzniklo min. 15 nových pracovních míst. Ne všichni žadatelé se k tvorbě míst chtějí v žádosti o dotaci zavázat. S ohledem na turbulentnost dnešní doby se obávají povinnosti místa udržovat (pod hrozbou zpětného vrácení dotace) v době udržitelnosti projektu.

V rámci dotazníkových šetření realizovaných při zpracování střednědobé a ex-post evaluace reagovali respondenti následovně:

Graf 13: Dopad projektu na zaměstnanost v regionu

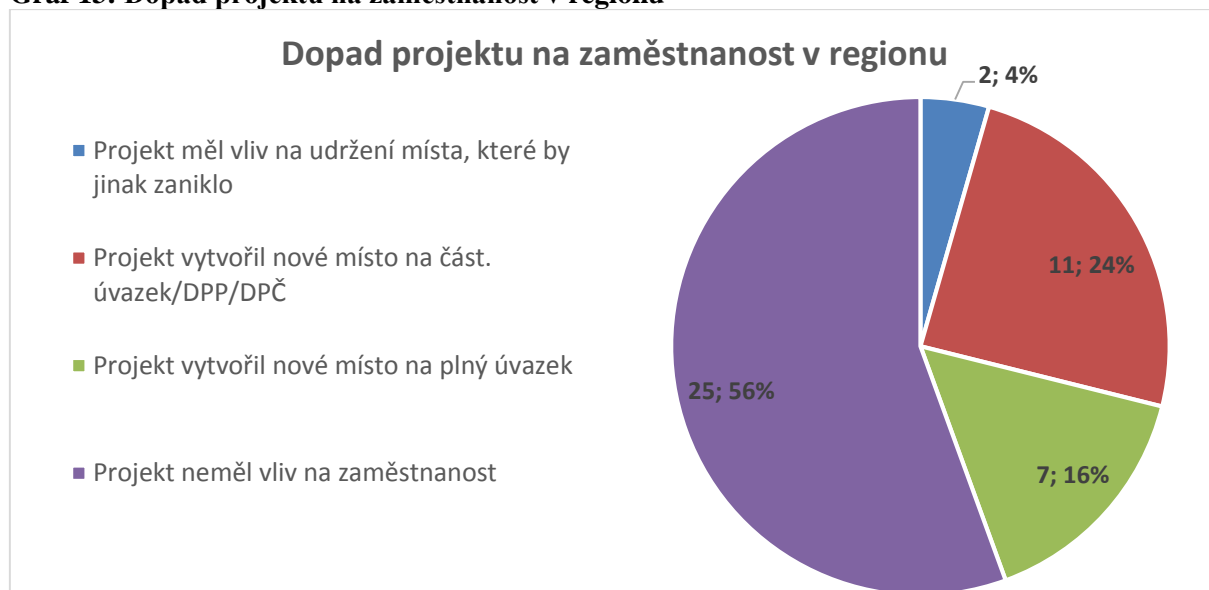

- ***Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?***

Téměř všechny projekty ve výzvách č. 4-8 zahrnovaly DPP či DPČ, a to vždy min. v rozsahu 40 hodin/projekt. Bodově bylo zvýhodňovány projekty zaměstnávající mladé osoby do 30 let a žen. **Realizací projektů zaměstnanost v regionu byla podpořena.**

- ***Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci?***

Tvorbu pracovních míst podporují i projekty směřované do technické infrastruktury a vzhledu obcí. Při bližším pohledu je zřejmé, že díky těmto zakázkám mnoho místních firem najímalo zaměstnance a tím potažmo přispěli ke snižování nezaměstnanosti v regionu. **Diverzifikace činnost byla podpořena** především díky fichím 4 a 5, které se věnovaly podnikatelskému sektoru. Celkem bylo do těchto 2 fichí podáno 26 žádostí o dotaci, z toho bylo doporučeno ke schválení 19 projektů, z nichž úspěšně bylo dokončeno a proplaceno 14 za 8,7 mil. Kč.

Vezmeme-li v potaz jen velmi zjednodušený výpočet, že drtivá většina nových pracovních míst vznikla právě v těchto 2 fichích, tak vychází **zřízení 1 nového pracovního místa na 8,7 mil. / 12 pracovních míst = 725 000 Kč**. Pro srovnání uvádíme, že na nové programové období 2014-2020 je v rámci Programu rozvoje venkova považováno za efektivní, je-li nové pracovní místo zřízeno za částku max. 200 tis. Euro, tj. 5,4 mil. Kč.

## **B) Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?**

### **PRIORITA 1. KVALITA ŽIVOTA NA VENKOVĚ**

Realizací projektů v rámci fiche 1 došlo více než k naplnění cíle zlepšit základní občanskou vybavenost nezbytnou pro spokojený život našich obyvatel. Došlo také ke kýženému zvýšení kapacity parkovacích ploch, estetické úrovně veřejných prostranství na území MAS, bezpečnosti na komunikacích prostřednictvím jejich vyšší kvality a lepšího značení. Realizovány byly i projekty zaměřené na budování kanalizace a ČOV v MAS.

Nedošlo k realizaci žádného projektu zaměřeného na vznik či aktualizaci územních plánů. Důvodem bylo čerpání dotací na tyto projekty z jiných dotačních titulů.

**Zahrnuto ve Fiche č. 1 Obnova a rozvoj kvality života na venkově**



Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 1	Plánovaná hodnota indikátoru k 31.12.2013	Naplnění indikátoru k 30.6.2015
Počet realizovaných projektů v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury vč. vodohospodářské	15	22
Počet projektů plně/částečně zaměřených na zlepšení vzhledu obcí	6	9
Počet nově vzniklých/aktualizovaných územních plánů obcí	1	0

## PRIORITA 2. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY NA VENKOVĚ

Díky výzvám podporujícím projekty z fiche č. 2 vznikly lepší podmínky pro nárůst kvality života na venkově, ke zvyšování atraktivity území, a to např. pomocí zvýšení míry využití objektů občanské vybavenosti, snížení % nevyužívaných prostor a budov, zlepšení technického stavu objektů a prostor nezbytných pro rozvoj občanské vybavenosti, podpory kulturních, zájmových, vzdělávacích a sportovních organizací, spolků a církve.

### Zahrnuto ve Fiche č. 2 Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 2	Plánovaná hodnota indikátoru k 31.12.2013	Naplnění indikátoru k 30.6.2015
Počet nových/zrekonstruovaných budov/ploch sloužících pro zajištění občanské vybavenosti	15	24
Počet nových/zrekonstruovaných objektů a ploch sloužících pro sportovní rekreaci využití	2	9
Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených ženami/lidmi do 30 let *	3	12

\* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7.

## PRIORITA 3. KULTURNÍ DĚDICTVÍ A TRADICE NAŠEHO VENKOVA

Fiche č. 3 cílila do péče o veškeré typy památek, zajímavých, jedinečných míst. Byly realizovány projekty bojující proti devastaci kulturního dědictví, zvýšil se počet revitalizovaných památek MAS. Podpořeny byly i tvorby studií, průzkumů a analýz obnovy kulturního dědictví vč. konkrétní podpory vzniku nových či obnovených expozic a muzeí.

### Zahrnuto ve Fiche č. 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 3	Plánovaná hodnota indikátoru k 31.12.2013	Naplnění indikátoru k 30.6.2015
Počet obnovených či zhodnocených památkových objektů, ploch, území	15	9
Počet studií, průzkumů a analýz obnovy či využití, regenerace kulturního dědictví venkova	2	7
Počet nových či obnovených expozic a muzeí	1	3
Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených ženami/lidmi do 30 let *	3	12

\* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7.



**PRIORITA 4. CESTOVNÍ RUCH**

Cílem priority č. 4 bylo zvýšit počet turistů a jejich spokojenost, podpořit prodloužení délky jejich pobytu na území MAS, zlepšit image regionu Sokolovsko, zkvalitnit a rozšířit nabídku základní infrastruktury a doplňkové infrastruktury pro CR. Toto mělo být dosaženo budování/rekonstrukcí ubytovacích/stravovacích zařízení a půjčoven sportovního vybavení.

**Zahrnuto ve Fiche č. 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu**

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 4	Plánovaná hodnota indikátoru k 31.12.2013	Naplnění indikátoru k 30.6.2015
Počet nových/zrekonstruovaných ubytovacích/stravovacích zařízení v CR	1	1
Počet nových/zrekonstruovaných/dovybavených půjčoven sportovního vybavení	3	1
Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených ženami/lidmi do 30 let *	3	12

\* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7.

34

**PRIORITA 5. PODNIKÁNÍ**

Realizací projektů ve fichi č. 5 byl více než naplněn plán podpořit růst zaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit na území MAS Sokolovsko. Oproti plánovaným 3 nově vzniklým pracovním místům jich bylo vytvořeno v této fichi 10 (+ 1 další místo ve fichi č. 3). Naplněn byl i indikátor nově vzniklých ekonomických subjektů.

**Zahrnuto ve Fiche č. 5 Rozvoj drobného podnikání**

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 5	Plánovaná hodnota indikátoru k 31.12.2013	Naplnění indikátoru k 30.6.2015
Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených ženami/lidmi do 30 let *	3	12
Počet nových ekonomických subjektů	1	1

\* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7.

**PRIORITA 6. VZDĚLÁVÁNÍ**

Cíl zvýšit vzdělání a kvalifikaci pracovníků hospodářských subjektů a obyvatel venkova byl naplněn realizací 2 vzdělávacích projektů a vybudováním/zrekonstruováním 2 vzdělávacích center (a také velkého množství školských zařízení).

**Zahrnuto ve Fiche č. 6 Vzdělávání a šíření informací na venkově**

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 6	Plánovaná hodnota indikátoru k 31.12.2013	Naplnění indikátoru k 30.6.2015
Počet zrekonstruovaných/nově zřízených vzdělávacích center a/nebo počet uskutečněných vzdělávacích projektů	4	4
Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených ženami/lidmi do 30 let *	3	12

\* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7.





**PRIORITA 7. VENKOVSKÁ TURISTIKA**

Pohledem na monitorovací indikátor počet km vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek by se dalo říci, že cíl nebyl naplněn. Vznikla pouze jedna pěší trasa v Dolním Rychnově. Cílem priority byla však především podpora zpřístupnění zajímavých míst na území MAS. Tohoto cíle dosaženo bylo podpořeným 2etapovým projektem vybudován rozhledny Cibulky, ze které je úžasný výhled na Krušné hory. Stavba má navíc velmi nezvyklý tvar, který turisté pozitivně hodnotí. Stala se velmi oblíbenou rozhlednou v západních Čechách.

35

**Zahrnuto ve Fiche č. 7 Rozvoj venkovské turistiky**

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 7	Plánovaná hodnota indikátoru k 31.12.2013	Naplnění indikátoru k 30.6.2015
Počet km vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek	10	0,186
Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených ženami/lidmi do 30 let *	3	12

\* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7.

**Obr. č. 1: Rozhledna Cibulka a pohled z rozhledny na Oloví a Krušné hory**



*Zdroj: foto vlastní*



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

**C) Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?*****Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (mladí lidé/ženy)?***

Při řešení této otázky vycházíme z 2 základních zdrojů informací. V první řadě je to monitoring projektů, ze kterého je na první pohled patrné, kdo dané prostory, vybavení či území využívá a jakým způsobem. Zajímavé výsledky však poskytlo i dotazníkové šetření. Nejčastěji se objevují odpovědi typu:

- na realizaci projektu jsme uzavřeli DPP s mladými lidmi/ženami, ti se tak zapojí do aktivit obce a současně si zlepší svou ekonomickou situaci, snažíme se zapojovat hlavně studenty a ženy na rodičovském dovolené
- díky realizaci projektu mohou jeho výsledky (především hřiště, kulturní domy apod.) využívat mladí lidé, často jsme vzhledem k technickému stavu objektů řadu aktivit vypouštěli, nyní se vracíme zpět k tradicím (sportovní poháry, kulturní akce,...)
- tím, že jsme mohli zrekonstruovat objekty sloužícím mladým lidem, značně se rozšířila naše členská základna, nyní chodí i mladí lidé proto, že se jim u nás líbí
- do řady aktivit se zapojili dobrovolníci, ať už do plánování (objevuje se velmi často), tak i při samotné realizaci, pomáhali např. při závěrečném úklidu po stavbě, sami si místo udržují, více si tak výstupů projektů váží

Lze říci, že většina projektů přispěla k rozvoji volnočasových aktivit mladých lidí na území MAS Sokolovsko. Toto potvrdily i souhrnné výsledky z dotazníkových šetření realizovaných v rámci střednědobé a závěrečné evaluace SPL, na něž celkem odpovědělo 43 respondentů.

**Graf 14: Vliv projektu na zapojení mladých lidí**



Na tuto otázku lze odpovědět „šalamounsky“ tím, že ženy tvoří cca polovinu našeho obyvatelstva a tudíž každý projekt, který se jakkoli dotýká života lidí, ovlivňuje i místní ženy. Podíváme-li se však na projektu podrobně lze konstatovat, že stejně jako v případě mladých lidí velmi často došlo k jejich aktivizaci a zapojení do místního života.


Ženy bývají velmi často součástí realizačního týmu – především jej hlídají pro finanční stránce. Obvykle také řeší samotné vyúčtování projektu. Z tohoto důvodu mnoho žadatelů uzavřelo DPP s místními ženami, které jim pak s projektem pomáhaly.

Stejně tak i samotné výstupy projektů jsou ženami využívány. Jedná se především o budovy fungující jako kulturní domy, či památky.

Ačkoli podpora napomohla zapojení žen a mladých lidí do regionu, rozhodli jsme se počátkem r. 2010 k ještě větší podpoře projektů, které jsou buď navrhovány, řešeny nebo cíleny na ženy a mladé lidi. Z tohoto důvodu došlo k úpravě hodnotících kritérií a jejich naplnění bylo výrazně bodově navýšeno. Toto se pozitivně promítlo do řešení dané otázky.

Ze 43 respondentů, kteří reagovali na dotazníková šetření prováděná v rámci evaluace mezi žadateli a příjemci dotací v rámci SPL MAS Sokolovsko, 63 % odpovědělo, že projekt měl pozitivní dopad na zapojení žen do dění v regionu.

**Graf 15: Vliv projektu na zapojení žen**

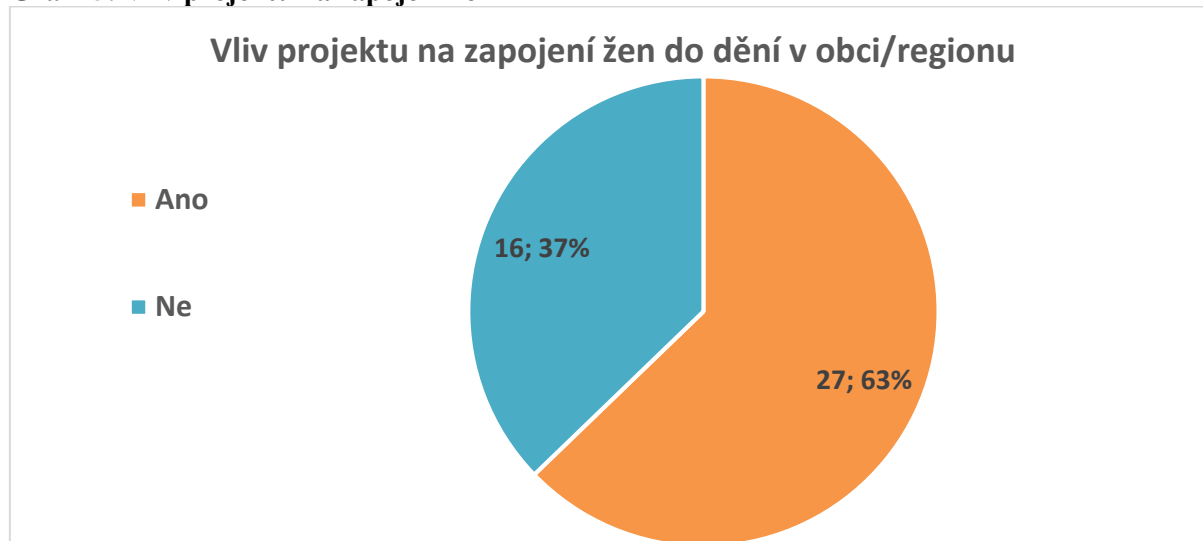

***Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?***

MAS Sokolovsko v období 2009-2014 měla kromě správní a dozorčí rady (orgány povinné s ohledem na zákon o obecně prospěšných společnostech), zřízenou také valnou hromadu, výběrovou komisi, programový výbor a komise pro činnost žen, mladých lidí a zemědělců. Téměř všichni partneři a zájemci o regionální rozvoj obecně tak měli možnost se podílet na rozhodovacích procesech.

Protože jedním z našich cílů bylo co nejvíce plánovat projekty v souladu s míněním veřejnosti, bylo jedno z hodnotících kritérií komunitní projednání projektu (tj. workshopy) a dále zveřejnění informací o projektu na webových stránkách, vývěskách, novinách apod. Naprostá většina žádostí o dotaci, resp. jednotlivé projektové záměry, byly dopředu relevantní veřejnosti představeny a zájemci z řad obyvatel tak měli možnost se k nim vyjádřit.

**O zájmu o partnerství v MAS Sokolovsko svědčí i fakt, že v průběhu let 2009 až 2015 došlo k navýšení počtu partnerů z cca 20 na rovných 75 (podnikatelé, obce, neziskové společnosti, ale i dobrovolníci z řad občanů).**

***Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?***

V rámci střednědobé evaluace jsme dospěli k závěru, že žadatelé se k víceodvětvovým přístupům zavazují jen velmi málo. Většinou pouze v rámci projednání projektu s místními občany či zainteresovanými společnostmi.

Z tohoto důvodu již počátkem r. 2011 došlo ke změně hodnotících kritérií fichí MAS Sokolovsko. Objevilo se např. kritérium naplnění partnerství, a to se subjekty jak z veřejné, tak podnikatelské a neziskové sféry. Ukázalo se, že žadatelé nemají potíže vhodné partnery pro projekty zajistit. V řadě projektů toto partnerství vedle k opravdu výborným výsledkům. Např. místní podnikatelé zdarma doplnily projekt obce o výsledky své činnosti (např. jedna stavební firma zdarma udělala doprovodné práce při úpravě zeleně, která byla narušena při realizaci projektu obce).

Další snahou MAS Sokolovsko podpořit víceodvětvové přístupy spočíval ve vyšším bodovém hodnocení projektů, které mají dopad na širší území či rozsáhlou zájmovou oblast. Tím, že projekt zasahoval do více katastrálních území, bylo nutné, aby jej žadatel prodiskutoval a měl schválený větším počtem subjektů. Mezi našimi žadateli byly i mikroregiony a svazky obcí.

**Víceodvětvovému přístupu v řešení regionálních projektů bylo značně napomoženo.**



***Jak napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů?***

Hledání nových cest řešení potíží je u nás podporováno především obrovskou konkurencí mezi projekty. V 8 uskutečněných výzvách bylo předloženo 161 projektů, schváleno jich však bylo jen 105 (tj. 70% úspěšnost). Toto žadatele nutí přemýšlet nad způsobem plánování a realizace projektů. Inovační přístup projektu je také jedním z hodnotících kritérií. Lze jej dosáhnout mimo jiné komunitním projednáváním s občany a zainteresovanými subjekty, volbou specifického technického řešení, výběrem inovativního způsobu financování či samotné realizace.

Na základě monitoringu realizovaných projektů můžeme konstatovat, že **naprostá většina žadatelů se pokouší přistupovat k projektům inovativně**. Z naší strany bychom do budoucna přivítali větší osobitost a individuálnost v samotném definování obsahu projektu.

***Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?***

MAS Sokolovsko v uplynulém programovém období podala následující žádosti o realizaci projektů spolupráce:

**Rok 2008: Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS**

Proplaceno 24. 9. 2010: dotace pro MAS Sokolovsko 2 339 188 Kč.

**Rok 2010: Řemeslo má zlaté dno**

Proplaceno 29. 4. 2013: dotace pro MAS Sokolovsko 1 209 236 Kč.

**Rok 2012: Dejme mladým lidem příležitost formovat budoucí venkov**

Žádost nebyla schválena.

**Rok 2012: Vzdělaný venkovan**

Žádost nebyla schválena.

**Rok 2012: To co frčí v pohraničí**

Žádost nebyla schválena.

**Rok 2013: Svatomariánská poutní cesta**

Žádost nebyla schválena.

**Rok 2013: Svatomariánská poutní cesta**

Žádost nebyla schválena.

**Rok 2015: Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje**

Proplaceno 30. 11. 2015: dotace pro MAS Sokolovsko 499 347 Kč.



Z 8 žádostí o dotaci na projekty partnerství MAS byly tedy úspěšné 3. Tyto projekty vedly nejenom k tvrdým (investičním) výstupům, ale především k získávání nových kontaktů a vazeb na pracovníky jiných MAS. Často tak docházelo i k výměně zkušenosti o fungování metody Leader, o nastavení hodnotícího systému, o zapojení veřejnosti apod. Toto považujeme za jedno z největších pozitiv projekt partnerství vůbec.

### ***Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?***

MAS Sokolovsko byla v uplynulém období aktivním členem **Celostátní sítě pro venkov**. S jejich pracovníky jsme byli v častém kontaktu. O spolupráci v dalších letech máme eminentní zájem a považujeme ji za velmi přínosnou.

MAS Sokolovsko je také dlouholetým členem **Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s.** Ředitelka MAS Sokolovsko je náhradníkem předsedy Krajské sítě MAS Karlovarského kraje a jako taková zastupuje předsedu na jednáních Výboru NS MAS ČR. Současně je členkou Pracovní skupiny Leader, která se podílela na formování pravidel IV. osy Leader PRV. Další pracovnice MAS Sokolovsko, Ing. Markéta Hendrichová je členkou Pracovní skupiny Vzdělávání a Ing. Eva Slámová je členka Pracovní skupiny pro Mezinárodní aktivity.

MAS Sokolovsko aktivně spolupracuje také se Svazem místních samospráv a řadou dalších partnerství, nikoli však na základě písemné smlouvy.

Pracovnice a zástupci MAS se pravidelně se účastnili akcí a setkání, která probíhala za účasti velkého počtu zástupců MAS z různých regionů ČR i zahraničí, a také zástupců ostatních subjektů, kteří mají bohaté zkušenosti s rozvojem venkovských oblastí. Jednalo se např. o akce Leader fest, výstava Země živitelka, výstava Má vlast, národní konference Venkov ad.

Vedle výměny zkušeností v rámci Národní sítě MAS, Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje a Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. se pracovníci MAS účastnili exkurzí do MAS v okolních regionech.

Ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. a MAS Český les z.s. docházelo k výměně zkušeností a inspirace při provádění vzájemných hodnocení těchto MAS (provedeno v r. 2011 a 2012). Na základě výsledků šetření byly vypracovány zprávy, ve kterých si navzájem zapojené MAS vyhodnotily své poznatky a doporučily návrhy pro zlepšení fungování. Závěry z těchto doporučení byly postupně zapracovány do činnosti a směrnic MAS Sokolovsko.




**D) Do jaké míry přispěla implementace přístupu Leader ke zlepšení místní správy?*****Byla dostatečná propagace MAS Sokolovsko a animace metody LEADER u veřejnosti?***


Na základě komunikace s potenciálními žadateli na školeních a různých setkáních, které jsme organizovali, vyplynulo, že obecná znalost veřejnosti o metodě Leader i o činnosti místních akčních skupin je naprosto mizivá. Netýká se to pouze našeho regionu, či naší republiky.

Informováni jsou pouze ti, kteří se aktivně zabývají regionálním rozvojem a jsou činorodí na venkově. Avšak s ohledem na fakt, že právě tito lidé tvoří jednu z našich hlavních cílových skupin, je důležité, aby byli spokojeni s naším fungováním a měli o našich aktivitách přehled.

Z dotazníkového šetření mezi žadateli naprosto drtivě vyplynulo, že propagace našich aktivit je dostatečná. Ze souhrnných informací dvou šetření, která byla uskutečněna mezi žadateli/příjemci ze SPL MAS Sokolovsko vyplývá, že 42 ze 43 respondentů zná web MAS Sokolovsko.


**Graf 16: Znalost webu MAS Sokolovsko**

Sejný počet respondentů v rámci šetření uvedlo, že na webových stránkách MAS Sokolovsko našlo potřebné informace.

**Graf 17: Data na webu MAS Sokolovsko**

Respondenti v rámci dotazníkového šetření dále odpovídali na otázku, zda se v poslední době na nějaké akci či v tisku setkali s logem MAS či informací o ní. Zde již se objevil menší rozdíl v odpovědích. 40 ze 43 respondentů odpověděl souhlasně, 3 odpověděli záporně.


**Graf 18: Propagace MAS Sokolovsko**

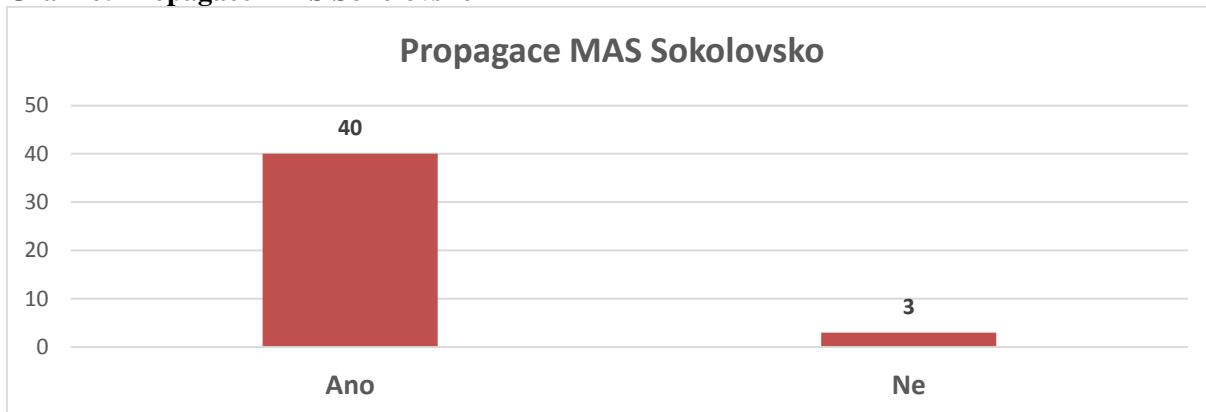

42

V rámci šetření byli respondenti tázáni, zda považují aktivity MAS za významné pro region. Na tuto otázku odpověděli naprosto všichni respondenti pozitivně. Toto považujeme za obrovskou pochvalu a tróufáme si konstatovat, že cíle SPL jsme naplnili dle potřeb regionu.


**Graf 19: Význam aktivit MAS Sokolovsko**



S animací metody Leader bezpochyby souvisí také **způsob, jakým se žadatelé dovědí o tom, že MAS vyhlásila výzvu** na předkládání žádostí o dotaci. MAS Sokolovsko při všech výzvách využila osobní, telefonické a emailové kontakty, informovala veřejnost o výzvách v místním tisku a samozřejmě také na svých webových stránkách. Z dotazníkového šetření mezi žadateli o dotaci v MAS Sokolovsko vyplynulo, že nejčastěji se o výzvě dověděli prostřednictvím **přímého e-mailu** od pracovníků MAS, na druhém místě jsou **webové stránky** MAS či partnera MAS a na třetím místě se objevil jako zdroj informací o výzvách partner nebo pracovník MAS.



Graf 20: Zdroj informací o výzvách SPL MAS Sokolovsko

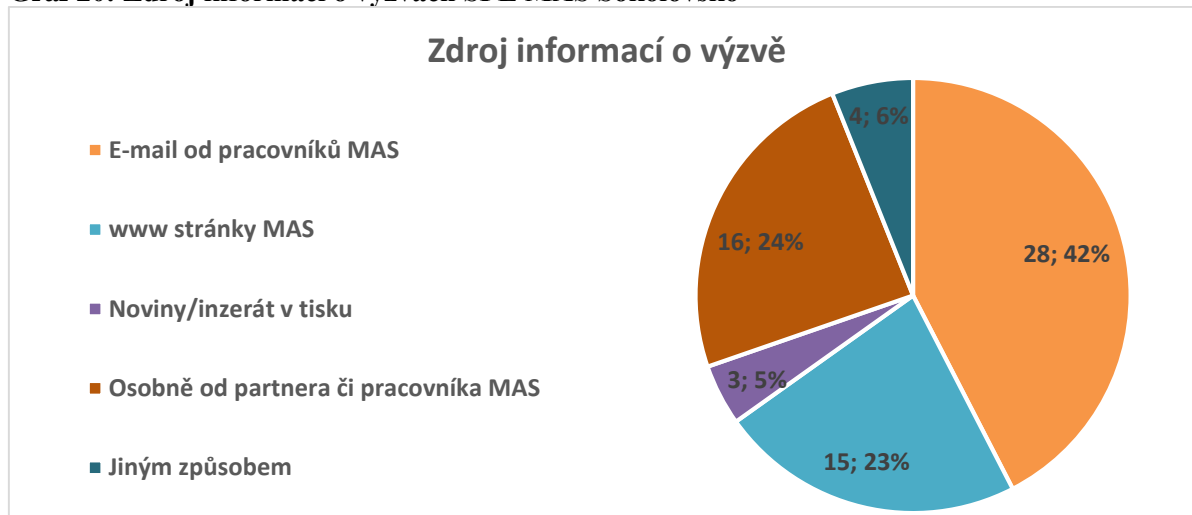


43

### Dobrovolné hodnotící otázky

#### *Jak jste zpracovali žádost o dotaci?*

Během 2 provedených dotazníkových šetření (v rámci střednědobé a závěrečné evaluace SPL) zodpovědělo celkem 43 žadatelů na tuto otázku. Více než polovina respondentů si žádost vypracovala sama, při využití rad pracovníků MAS Sokolovsko. Přibližně třetina respondentů využila služeb externí poradenské agentury. Pouze 5 ze 43 dotázaných si žádost vypracovalo samo pouze na základě studia podmínek programu. 1 respondent na tuto otázku neodpověděl.

Graf 21: Zpracování žádosti o dotaci

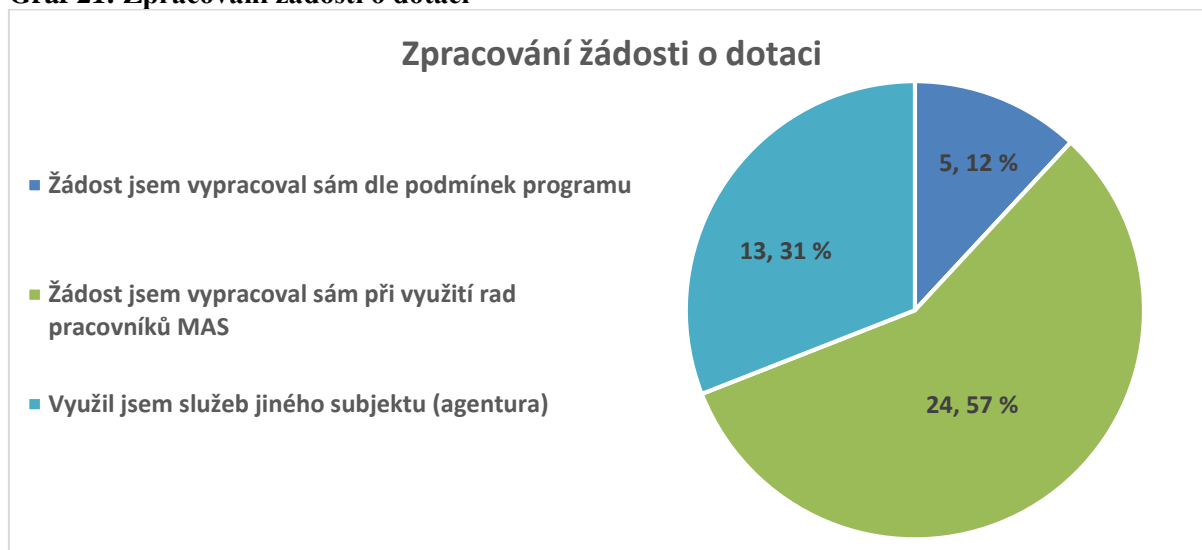


Z pohledu pracovníků MAS Sokolovsko se jako efektivní jeví první dvě možnosti. Varianta, že si žadatel sám žádost o dotaci zpracuje, sebou nese nadměrné riziko chyb a nepřesností.





***Jak jste zpracovali žádost o proplacení a závěrečné vyúčtování dotace?***

Tato otázka byla také položena respondentům v rámci 2 dotazníkových šetření k SPL. Většina (63 %) odpověděla, že si vyúčtování zpracovala sama za pomoci rad pracovníků MAS. Dále 15 % respondentů využilo služeb externí společnosti (pro zajímavost toto je pouze polovina oproti počtu subjektů, kteří využili externí firmu při zpracování žádosti o dotaci). Z toho lze usoudit, že příjemci dotací považují za složitější žádost o dotaci, než samotné vyúčtování. Částečně tím také ze svých beder snímají riziko potencionálního neúspěchu. Vzhledem k tomu, že první dotazníkové šetření proběhlo v roce 2011, kdy řada projektů byla ještě v realizaci, nemohlo 5 respondentů tuto otázku ještě zodpovědět. Pouze 4 ze 43 dotázaných si dle svých odpovědí vyúčtování zpracovalo samo. 2 respondenti na tuto otázku neodpověděli.

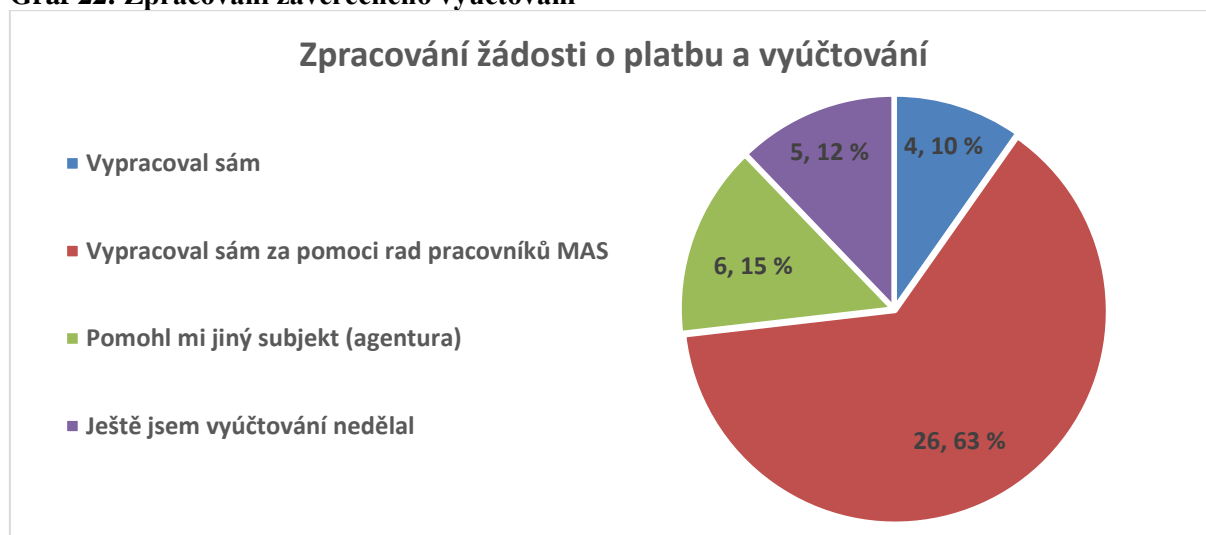**Graf 22: Zpracování závěrečného vyúčtování*****Považujete administraci projektu přes MAS Sokolovsko oproti žádostem podávaným přímo do Programu rozvoje venkova nebo jiných programů za složitější?***


V rámci zjištění potřebnosti podpory žadatelů o podporu jsme v dotazníkových šetřeních zjišťovali, nakolik složitou považují žadatelé administraci projektů přes MAS Sokolovsko v porovnání s jinými dotačními tituly. Naprostá většina žadatelů vyhodnotila administraci za méně náročnou. Svědčí o tom i fakt, že vyúčtování a proplacení projektů si naprostá většina dotázaných řešila sama jen za pomoci rad pracovníků MAS Sokolovsko. Bohužel s ohledem na načasování prvního dotazníkového šetření, nebyla řada respondentů schopna na tuto otázku



odpovědět, protože ještě neměli projekt dokončený a také proto, že v dané době ještě neměli zkušenosti s jinými dotacemi či žádostmi do Programu rozvoje venkova napřímo.

Je potřeba dodat, že s cílem podpořit potenciální příjemce prováděli pracovníci MAS pravidelná školení, poskytovali konzultace a poradenství ve všech fázích zpracování projektu.

**Graf 23: Porovnání složitosti administrace projektů přes MAS**

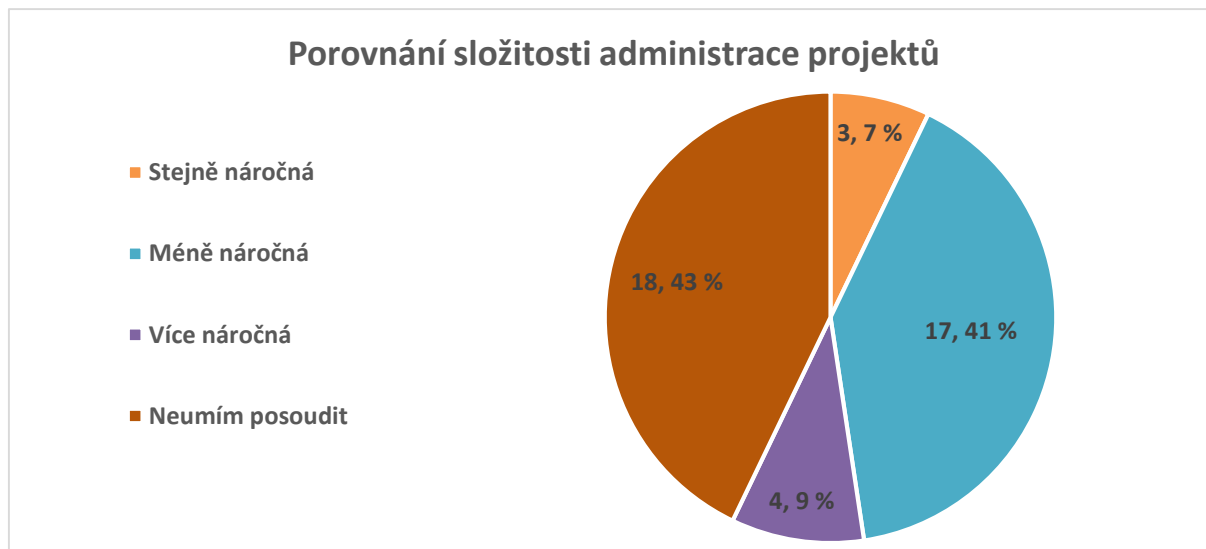


Toto považujeme za jeden z nejvýznamnějších výstupů tohoto hodnocení, neboť dokládá, že samotní žadatelé považují žádosti realizované přes MAS Sokolovsko za méně náročné v porovnání s žádostmi podanými napřímo do Programu rozvoje venkova. Svědčí to o přínosu metody Leader, je-li prováděná poctivě a se zaměřením na konkrétní potřeby místních subjektů a také o kvalitě práce odváděné pracovníky MAS.

***Využívali jste během realizace projektu podpořeného v rámci SPL MAS Sokolovsko rad pracovníků MAS?***

O tom, že příjemci podpory opravdu aktivně využívali rad a pomoci od pracovníků MAS svědčí i odpovědi na tuto otázku. Ze 43 dotázaných 37 odpovědělo, že se obraceli s žádostmi o radu na pracovníky MAS. Dále 5 respondentů odpovědělo, že měli externí subjekt, který za ně potřebný servis k projektu zajišťoval. Avšak i pracovníci poradenských agentur se na MAS často obraceli. Pouze 1 dotázaný odpověděl, že nepotřeboval žádné pomoci, vše si podle potřeby našel v Pravidlech PRV.

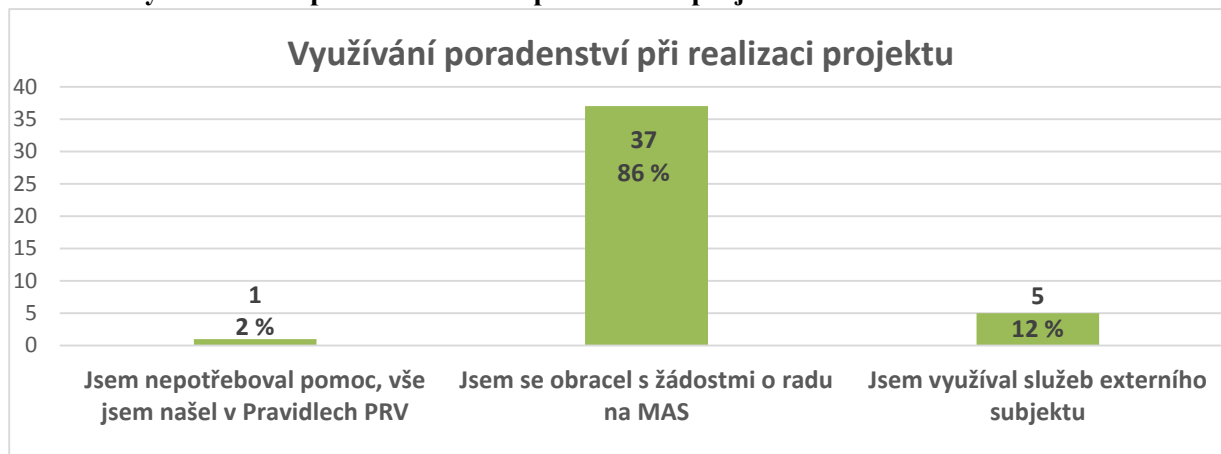


**Graf 24: Využívání rad pracovníků MAS při realizaci projektu**

46

***Považujete za přínosné, aby byl příjemce povinen hlásit průběh realizace projektu pracovníkům MAS, a pokud ano, jak často?***

Především s cílem co nejlépe se připravit na nové programové období, byla respondentům položena také výše uvedená otázka. Důvodem proč povinné podávání hlášení o tom, jak realizace projektu probíhá, je naše snaha včas zabránit případným chybám a zlepšit tok informací mezi žadatelem a MAS. Na druhou stranu není naším cílem navyšovat pracnost administrace projektu příjemcům. Touto otázkou získali příjemci možnost se sami k této problematice vyjádřit.


Na otázku, zda považují za přínosné, aby bylo povinné hlásit průběh realizace projektu, měli dotázaní možnost zvolit více odpovědí. Ze 43 respondentů tak vzešlo 50 odpovědí. Je tedy zřejmé, že někteří zvolili více variant. Výsledky jsou následující.

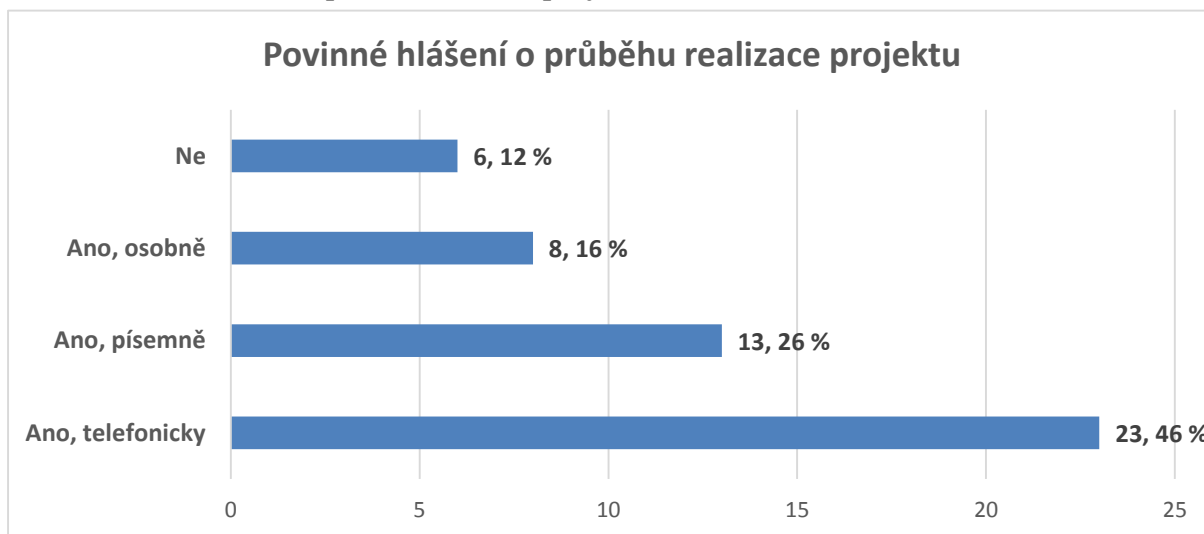**Graf 25: Povinnost hlásit průběh realizace projektu na MAS**

Většina dotázaných odpověděla, že by považovala za přínosnou povinnost hlásit průběh realizace projektu pracovníkům MAS telefonicky. Dále 26 % by volilo písemnou cestu a 16 % osobní formu. Naopak proti této povinnosti bylo 12 % odpovědí.

Dotázaní ovšem měli i možnost určit, jak často by se hlášení měla podávat. Na výběr měli možnost 1x měsíčně, 1x za 3 měsíce a nebo 1x za půl roku. Z odpovědí vzešel naprosto stejný výsledek 44 % pro hlášení 1x za měsíc i pro hlášení 1x za 3 měsíce.

**Graf 26: Frekvence podávání hlášení o průběhu realizace projektu na MAS**

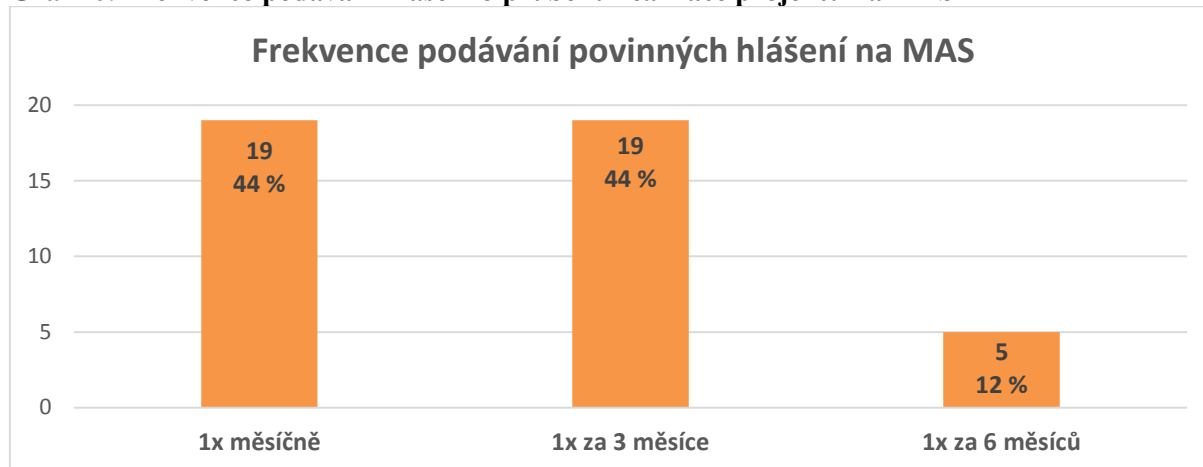

S ohledem na fakt, že většina projektů má délku realizace větší než 1 rok, kloní se pracovníci MAS k variantě kombinací výše uvedeného. Tj. např. střídání telefonického a písemného hlášení vždy 1x za 3 měsíce. Při projektu trvajícím 1 rok, by tak byla podána 2 telefonická a 2 písemná hlášení, přičemž 2. hlášení by bylo nahrazeno závěrečným vyúčtováním projektu.



## 5. Závěry a doporučení

### 5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů s prioritami a cíli, rovnováha mezi fichemi

Úvodem je nutno uvést, že v době zpracování SPL nám byly jen velmi obecně známé objemy prostředků, které budeme mít k dispozici, stejně tak např. limity prostředků na jednotlivé projekty apod. Z tohoto důvodu bylo nadefinování monitorovacích indikátorů v podstatě pouze kvalifikovaným odhadem, což se samozřejmě také projevilo při revizi souladu plánu a skutečnosti monitorovacích indikátorů.

Z analýzy výzev vyplývá, že největší zájem byl o projekty v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury (fiche 1) a o aktivity spojené s budováním a obnovou budov a ploch sloužících pro zajištění občanské vybavenosti (fiche 2). Oba tyto monitorovací indikátory byly mnohonásobně překročeny. Je nutno podotknout, že se jedná o aktivity, které budou v nastávajícím programovém období 2014-2020 jen obtížně datovatelné z fondů EU.

O projekty aktualizace a tvorby územních plánů obce nejevily zájem především z toho důvodu, že prostředky na tyto aktivity mohly získat i z jiných zdrojů (příspěvek kraje, IOP).

Překvapivě malý zájem byl o projekty v oblasti pěších, lyžařských a hippostezek. Potenciální žadatelé se obávají především problémů spojených s údržbou těchto stezek po ukončení realizace projektu. Za celé období SPL byl předložen a schválen pouze 1 projekt pěší stezky, díky kterému bylo vytvořeno 186 m z plánovaných 10 km tras.

Velmi malý zájem je ze strany podnikatelů v oblasti budování infrastruktury v cestovním ruchu – ať už se jedná o ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny sportovního vybavení či budování objektů a ploch pro sportovně-rekreační vyžití. Problém spočívá především v určité nedůvěře podnikatelů v dotační systém ČR a EU a pak také v předfinancování projektu. Lze však konstatovat, že počet podnikatelů žádajících o dotace z výzev SPL MAS Sokolovsko postupně rostl. Indikátor počtu ubytovacích a stravovacích zařízení byl naplněn na 100 %, indikátor pro půjčovny sportovního vybavení byl naplněn na 33 % a indikátor pro sportovně-rekreační areály dokonce byl přesažen až na hodnotu 450 %.

Během prvních výzev SPL nikdo neprojevil zájem o vybudování zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie (tzv. OZE). Vzhledem k tomu, že v průběhu r. 2011 bylo oznámeno, že na tyto aktivity nebude MZe/SZIF poskytovat dále prostředky, MAS zrušila tento monitorovací indikátor v rámci aktualizace SPL.



Opomenout samozřejmě nelze ani indikátory spojené s obnovou kulturního dědictví. Zájem žadatelů směřoval spíše do vytvoření studií, průzkumů a analýz obnovy kulturních památek. Zde byl plán přesažen o 250 %. Naopak projektů na samotnou rekonstrukci kulturních památek byl naplněn pouze z 60 % (obnoveno 9 z plánovaných 15 památek). Dále vzniklo 1 nové muzeum a 2 další byla obnovena, což představuje naplnění indikátoru na 300 %.

Fiche č. 6 byla věnována podpoře vzdělávání na území MAS. Zde se podařilo indikátor naplnit na 100 %.

Zbývající indikátory byly spjaté především s podnikatelským sektorem. Byl naplánován vznik 1 nového podnikatelského subjektu, což bylo přesně splněno. Řada dalších samozřejmě byla podpořena, ale nejednalo se o nové podniky, nýbrž o rozvoj existujících mikropodniků do 10 zaměstnanců.

V podstatě napříč všemi fichemi bylo možné podpořit vznik nových pracovních míst. Zde byl naplánován poměrně nízký výsledek 3 nových míst. Je fantastické, že díky projektům realizovaných v rámci SPL vzniklo nových míst 12.

Všechny výše popsané monitorovací indikátory považujeme za dostatečně vypovídající.

Co se týká rovnováhy mezi jednotlivými indikátory a prioritami, především z kapitoly 4, povinné otázky B vyplývá, že pro každou prioritu byl zvolen 1 cíl a jedna fiche. Dále pro každou fichi byly zvoleny 2 až 4 indikátory, což považujeme za velmi rovnoměrné a snadno přehledné rozdělení. Všechny fiche byly využity. Frekvence jejich vyhlášení odpovídala aktuální absorpční kapacitě území a objemu prostředků uvolněných pro jednotlivé výzvy.

## 5.2 Míra dosažení cílů

Na základě výše uvedených informací je možné zopakovat následující:

- podpora poskytovaná našemu regionu prostřednictvím Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko byla vynakládána účelně, přispěla k jeho rozvoji a obnově v souladu s cíli stanovenými jak v ISR, SPL, tak v jednotlivých fichích
- naplnění monitorovacích indikátorů dosáhlo hodnoty 168 %, což svědčí o značné opatrnosti ze strany MAS při definování jejich plánované hodnoty, je však nutno připomenout, že v době tvorby plánu nebyly známy celkové alokace ani míry podpory pro jednotlivé fiche, jednalo se tak opravdu o pouze kvalifikovaný odhad



- byla potvrzena potřeba pracovat na rozvoji partnerství a aktivně využít získané osobní vazby mezi partnery v ČR i v zahraničí
- samotná metoda LEADER i zaměření aktivit místních akčních skupin potřebuje výrazně navýšit propagaci a osvětu u široké veřejnosti
- z analýzy vývoje počtu partnerů lze konstatovat, že jejich počet je dostatečný a během let 2009-2015 měl rostoucí tendenci.

### 5.3 Doporučení na základě výsledku ex-post hodnocení SPL

50

Co se týká samotného fungování MAS a jejího plnění Programu rozvoje venkova metodou Leader doporučujeme:

- pokračovat v podpoře směřující do infrastruktury obcí, vzdělávání, drobného podnikání na venkově
- nadále je potřeba zapojovat se do veřejných aktivit, což nám napomůže propagovat činnost místních akčních skupin u místních obyvatel a subjektů
- snahy by neměly ochabnout ani v oblasti vyhledávání a zapojování nových partnerů do našich aktivit
- nepolevit v rozsahu poskytovaných konzultací, ať již osobních, telefonických či elektronických





## 6. Přílohy

### 6.1 Dotazník pro potřeby závěrečné evaluace SPL MAS Sokolovsko

Vážení,

tento dotazník byl vytvořen proto, abychom zjistili, jak činnost MAS Sokolovsko přispívá k rozvoji našeho regionu. Výsledky dotazníkového šetření budou podkladem pro závěrečné hodnocení činnosti MAS, které jsou všechny MAS povinny zhotovit a na SZIF předložit do konce roku 2015.

V případě, že za Vaši organizaci s MAS komunikuje někdo z kolegů či podřízených, prosím přepošlete mu tento dotazník k vyplnění. Dotazník je navržen tak, aby Vám zabral max. 5 minut. Odpovídejte prosím upřímně. Naším cílem je zlepšovat se.

V případě jakýchkoli otázek k dotazníku se prosím obraťte na Ing. Ivanu Jágríkovou, tel. 739 011 869, info@mas-sokolovsko.eu.

Děkujeme za Vaše odpovědi.

S pozdravem

pracovníci MAS Sokolovsko.

#### A) Dotované projekty

1. Žádal jste v minulosti o podporu svého projektu prostřednictvím výzev SPL MAS Sokolovsko?

- ☐ Ano, úspěšně.  
☐ Ano, neúspěšně, zkusím znovu.  
☐ Ano, neúspěšně, znovu již nezkusím.  
☐ Ne.

2. V případě, že jste žádal o dotaci, kdo Vám pomáhal s přípravou žádosti?

- ☐ Žádost jsem vypracoval sám na základě studia podmínek programu.  
☐ Žádost jsem vypracoval sám, avšak za využití rad pracovníků MAS Sokolovsko.  
☐ Jiný subjekt (např. agentura).

3. Administrace žádosti přes MAS Sokolovsko oproti žádostem podávaným přímo do PRV nebo jiných programů je:

- ☐ stejně náročná. ☐ méně náročná.  
☐ více náročná. ☐ neumím posoudit (jinde jsem dosud nežádal).

4. Žádost o proplacení a závěrečné vyúčtování dotace jsem si:

- ☐ vypracoval sám. ☐ vypracoval sám za pomoci rad pracovníků MAS.  
☐ pomohl mi jiný subjekt. ☐ ještě jsem nedělal.



5. Stručně popište svůj největší problém při plánování a realizaci Vašeho projektu:
6. Během realizace projektu podpořeného MAS:
- ☐ nepotřeboval jsem žádné informace, vše jsem si podle potřeby našel v pravidlech PRV.
  - ☐ obracel jsem se s žádostmi o radu na MAS.
  - ☐ měl jsem jiný subjekt, který mi zajišťoval potřebný servis.
7. Považujete za přínosné, aby byl žadatel povinen hlásit průběh realizace projektu pracovníkům MAS, čímž by došlo k zajištění toku informací mezi žadatelem a MAS a k možnému odstranění chyb?
- ☐ ano,
    - ☐ telefonicky.
    - ☐ písemně.
    - ☐ osobně.
  - ☐ ne.
8. Pokud ano, jak často by žadatel měl být povinen kontaktovat pracovníka MAS a sdělit mu informaci o průběhu realizace projektu?
- ☐ 1x měsíčně.
  - ☐ 1x za 2 měsíce.
  - ☐ 1x 3 měsíce.
9. Co je podle Vás největším přínosem realizovaného projektu:
10. O jaký druh projektů máte v současné době největší zájem?
- ☐ občanská vybavenost (kultura, zdravotnictví, školství, sociální služby, ad.).
  - ☐ obnova památek.
  - ☐ rozvoj podnikání, jaké?.....
  - ☐ cestovní ruch (ubytování, půjčovny sportovního vybavení, služby pro hosty apod.).
  - ☐ rozvoj zemědělství.
  - ☐ obnova infrastruktury obcí (komunikace, veřejná prostranství, zeleň, osvětlení, rozhlas ad.).
  - ☐ vzdělávací projekty.
  - ☐ jiné.....
11. Projekt, který jste realizoval prostřednictvím výzev SPL MAS Sokolovsko:
- ☐ měl vliv na udržení pracovního místa, které by jinak zaniklo.
  - ☐ vytvořil nové pracovní místo (vyplňte i v případě, že jste se k vytvoření pracovního místa žádostí nezavázali).
    - ☐ Na plný úvazek.
    - ☐ Na částečný úvazek (např. DPP, DPČ,...).
  - ☐ neměl žádný vliv na pracovní místa.
12. Projekt, který jste realizoval, napomohl zapojit mladé lidi do dění v obci/regionu?
- ☐ ano. Jak?.....
  - ☐ ne.



13. Projekt, který jste realizoval, napomohl zapojit ženy do dění v obci/regionu?

- ☐ ano. Jak?.....  
☐ ne.

### B) Propagace MAS a ostatní činnosti

14. Znáte www stránky MAS?

- ☐ ano. ☐ ne.

15. Našel jste tam potřebné informace?

- ☐ ano. ☐ ne. ☐ částečně.

16. Setkal jste se v poslední době na nějaké akci či v tisku s logem MAS či informací o ní?

- ☐ ano. ☐ ne.

17. Myslíte si, že aktivity MAS mají význam pro region a jsou dostatečné?

- ☐ ano.  
☐ ne. O jaké aktivity by měla MAS své činnosti rozšířit, případně z čeho by je mohla financovat?  
 .....

18. O možnosti získat podporu prostřednictvím MAS Sokolovsko jste se dozvěděl:

- ☐ jsem partnerem MAS a obdržel jsem výzvu.  
☐ ze zveřejněné výzvy na www stránkách MAS/partnera MAS.  
☐ z novinového článku/inzerátu.  
☐ od jiného partnera/pracovníka MAS.  
☐ jiným způsobem, popište:

19. Napadá Vás nějaký návrh na společný projekt nebo projekt realizovaný formou spolupráce s jinými MAS, který by se týkal rozvoje našeho území?

.....

20. Napadá Vás nějaká možnost, jak zlepšit činnost či fungování MAS? Např. v oblasti komunikace se žadateli, dostupnost konzultací, záběr činností apod.?

**Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.**



## 6.2 Výsledky 8 výzev SPL MAS Sokolovsko schválených SZIF

## 1. výzva (9/2009)

Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s.  
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/341/000145

Registrační číslo	Název subjektu	Název projektu	Hlavní opatření	Dotace (Kč)
09/008/41200/145/001492	Město Chodov	Rekonstrukce komunikace Chodov - Stará Chodovská	3211	1 800 000
09/008/41200/145/001565	Michal Málek	Nákup olejovačky hran	3120	240 864
09/008/41200/145/001613	Město Loket	Parkoviště Sportovní ulice - Gastro	3211	1 724 377
09/008/41200/145/001618	Hartenberg o.s.	Hartenberská doména-prezentace nadregionálně významných hodnot kulturního a přírodního dědictví	3220	1 527 786
09/008/41200/145/001633	Město Kynšperk nad Ohří	"Místní komunikace IV.třidy Kynšperk nad Ohří - Kamenný Dvůr"	3211	1 800 000
09/008/41200/145/001637	Obec Staré Sedlo	Stavební úpravy zahradního skladu	3220	876 024
09/008/41200/145/001640	Město Horní Slavkov	Zkvalitnění podmínek cestování hromadnou dopravou v Horním Slavkově	3211	1 326 283
09/008/41200/145/001648	Obec Krajčová	Umový háj - Krajčová	3211	370 542
09/008/41200/145/001653	Město Horní Slavkov	Oprava ohradní hřbitovní zdi Horní Slavkov	3220	642 186
09/008/41200/145/001658	Město Březová	Kostelní Břiza - stavební úpravy na návsi	3211	725 139
09/008/41200/145/001662	Obec Lomnice	Výstavba malého columbaria	3211	515 114
09/008/41200/145/001668	Obec Dolní Rychnov	Výstavba komunikace Černý Vrch - II. etapa	3211	1 458 801
09/008/41200/145/001670	Město Kraslice	Stavební úpravy dětského hřiště - modernizace Kraslice, Svatavská cesta	3212	896 275
09/008/41200/145/001678	Obec Šabina	Modernizace Mateřské školy Šabina	3212	880 414
09/008/41200/145/001681	Město Rotava	Autobusová zastávka v centru města "Sídliště"	3211	621 000
09/008/41200/145/001683	Město Krásno	Dětská hřiště v osadách Háje a Dolní Hluboká	3212	304 245
09/008/41200/145/001688	Obec Královské Poříčí	Výměna povrchu hřiště v Královském Poříčí	3212	1 687 060
09/008/41200/145/001700	BESTO PRO, s.r.o.	Rozšíření technického vybavení nové servisní dílny pro opravy malé zemědělské mechanizace	3120	459 328
09/008/41200/145/001701	Obec Kaceřov	Víceúčelová klubovna	3212	169 254
09/008/41200/145/001704	Obec Dasnice	Výměna oken a rekonstrukce střešy knihovny a tělocvičny v objektu obecního úřadu Dasnice	3212	508 235
09/008/41200/145/001722	Hartenberg o.s.	Základna pro mezinárodní dobrovolnické a komunitní projekty	3212	628 013
09/008/41200/145/001728	Město Rotava	Sportovní multifunkční hřiště	3212	1 405 899
09/008/41200/145/001733	Město Habartov	Centrum pro nejmenší KLUČ	3212	419 028

54

## 2. výzva (5/2010)

Registrační číslo	Název subjektu	Název projektu	Hlavní opatření	Dotace (Kč)
10/010/41200/145/001701	Obec Dolní Rychnov	Zřízení výtvarné dílny	3212	360 000
10/010/41200/145/001703	Město Březová	Vybudování integrovaného zázemí pro občanskou vybavenost	3212	1 800 000
10/010/41200/145/001705	Obec Libavské Údolí	Oprava-obnova střechy budovy Obecního úřadu v Libavském Údolí	3212	529 554
10/010/41200/145/001707	Obec Lomnice	Zateplení objektu družiny ZŠ Lomnice	3212	1 800 000
10/010/41200/145/001708	Město Krásno	Oprava střechy a výměna topení radnice v Krásnu	3212	1 680 984
10/010/41200/145/001711	TJ Dynamo Krajčová	Oplocení a zvelebení pozemku TJ Dynamo Krajčová	3212	301 800
10/010/41200/145/001715	Obec Jindřichovice	Obnova střechy obecního úřadu v Jindřichovicích	3212	1 800 000
10/010/41200/145/001739	Obec Chlum Svaté Maří	Obnova kapličky na Drsném vrchu Chlum Svaté Maří	3220	489 443
10/010/41200/145/001740	Město Kynšperk nad Ohří	Stavební obnova Kaple Kamenný Dvůr - Podlesí	3220	406 234
10/010/41200/145/001741	Římskokatolická farnost Kraslice	Obnova fasády kostela sv. Martina v Jindřichovicích	3220	1 437 124
10/010/41200/145/001742	Obec Šabina	Obnova místních komunikací ve východní části obce	3211	1 800 000
10/010/41200/145/001745	Město Kynšperk nad Ohří	"Obnova čekáren na zastávkách hromadné dopravy v okolí Kynšperka nad Ohří"	3211	405 000
10/010/41200/145/001749	Dronte - Loket, s. r. o.	Vodácké centrum Loket	3130	934 200
10/010/41200/145/001754	Město Horní Slavkov	Revitalizace veřejných prostranství na náměstí Republiky	3211	1 793 788
10/010/41200/145/001761	Město Rotava	Sportovní multifunkční hřiště III. etapa - komunikace	3211	997 019
10/010/41200/145/001769	Obec Hory	Hory - Jalový Dvůr - splašková kanalizace	3211	900 000
10/010/41200/145/001773	Obec Bukovany	Oprava opěrné zdi a schodiště - Bukovany	3211	784 134
10/010/41200/145/001774	Město Kraslice	Zvýšení bezpečnosti - prevence kriminality	3211	841 435

## 3. výzva (9/2010)

Registrační číslo	Název subjektu	Název projektu	Hlavní opatření	Dotace (Kč)
10/011/41200/145/002086	Město Habartov	Muzeum Habartov - průvodce do kapsy	3220	382 500
10/011/41200/145/002128	Petr Mikeš	Pořízení vybavení autoservisu Petr Mikeš	3120	525 900
10/011/41200/145/002140	PROFOREST s.r.o.	Nákup vybavení do provozovny nově založené společnosti PROFOREST s.r.o.	3120	267 000



## 4. výzva (5/2011)

Registrační číslo	Název subjektu	Název projektu	Hlavní opatření	Dotace (Kč)
11/013/41200/145/001253	Obec Královské Poříčí	Interaktivní muzeum řeky Ohře - 2. etapa	3220	1 800 000
11/013/41200/145/001259	Obec Hory	Dětské hřiště a klidová zóna pro matky s dětmi	3212	819 555
11/013/41200/145/001262	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRASLICE	Obnova vstupního objektu Sokolovny - I. etapa	3212	996 947
11/013/41200/145/001270	Město Chodov	Multifunkční hřiště - Stará Chodovská	3212	1 800 000
11/013/41200/145/001273	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BANÍK HABARTOV	Tribuna TJ Baník Habartov	3212	1 800 000
11/013/41200/145/001274	Město Nové Sedlo	Předškolní, školní a mimoškolní péče o děti tělovýchovou a sport v Novém Sedle	3212	1 799 930
11/013/41200/145/001276	Město Březová	"Rudolec - výstavba víceúčelového objektu"	3212	1 800 000

## 5. výzva (9/2011)

Název MAS: MAS Sokolovsko o. p. s.  
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/341/000145

55

Registrační číslo	Název subjektu	Název projektu	Hlavní opatření	Dotace (Kč)
11/014/41200/145/001845	Město Sokolov	Komunikace Novina	3211	1 534 581
11/014/41200/145/001846	Svazek obcí "Hornoslavkovsko"	Úpravy veřejných prostranství ve vybraných místních částech svazku obcí Hornoslavkovsko	3211	1 794 195
11/014/41200/145/001847	Obec Kaceřov	Ochrana a bezpečnost dětí a ostatních občanů	3211	268 200
11/014/41200/145/001848	Město Horní Slavkov	Oprava komunikace a instalace veřejného osvětlení v lokaltě "Svatopluk"	3211	1 131 655
11/014/41200/145/001849	Obec Šindelová	Obnova technické infrastruktury obce	3211	943 056
11/014/41200/145/001851	Město Nové Sedlo	"Zlepšení veřejně přístupných účelových komunikací v obci Nové Sedlo"	3211	1 142 665
11/014/41200/145/001852	Obec Chlum Svaté Maří	Chlum Svaté Maří - kanalizace, 3. etapa	3211	1 800 000
11/014/41200/145/001853	Jakub Fajt	"Vybavení ubytovacího zařízení na p.p.č. 1350/5 v k.ú. Bublava"	3132	288 341
11/014/41200/145/001854	OLIVIVUS s.r.o.	CLOUD	3120	1 148 536
11/014/41200/145/001855	Iveta Soukupová	Vybudování kanceláře pro administrativní činnost	3120	657 316
11/014/41200/145/001856	LaK centrum, s.r.o.	Rozšíření služeb v oblasti výroby barev a poradenství společnosti LaK centrum, s.r.o., Dolní Rychnov	3120	693 720
11/014/41200/145/001857	Marylin, spol. s r.o.	Strojní vybavení	3120	693 000
11/014/41200/145/001858	Obec Dolní Rychnov	Pěší trasa Dolní Rychnov - lesopark	3131	738 000

## 6. výzva (5/2012)

Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s.  
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/341/000145

Registrační číslo	Název subjektu	Název projektu	Hlavní opatření	Dotace (Kč)
12/016/41200/145/001431	Správa pamětihodnosti s.r.o.	Rozvoj tradičních řemesel na Statku Bernard v Královském Poříčí	3120	987 930
12/016/41200/145/001436	MAREK BOCHNÍČEK	Vybavení prodejny a skladu motodilů	3120	337 800
12/016/41200/145/001442	František Sláma	Rozšíření služeb při práci s kovy v obci Dolní Rychnov	3120	102 000
12/016/41200/145/001447	Město Olomí	Rozhledna "Cibulka" 1.etapa	3131	1 800 000
12/016/41200/145/001429	Vladimír Lokaj	Rekonstrukce fary v Krásně	3132	1 199 418
12/016/41200/145/001262	Obec Šindelová	Obnova komunikací v obci Šindelová	3211	916 855
12/016/41200/145/001271	Obec Hory	Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi	3211	1 165 970
12/016/41200/145/001283	Město Sokolov	Komunikace Novina - 2. etapa	3211	927 208
12/016/41200/145/001287	Obec Dolní Rychnov	Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním a vyhodnocením v obci Dolní Rychnov	3211	333 459
12/016/41200/145/001322	Město Kraslice	Kraslice - Most přes Kamenný potok v Příčné ulici	3211	1 800 000
12/016/41200/145/001325	Svazek obcí "Hornoslavkovsko"	Dětská hřiště Hornoslavkovska	3212	1 799 842
12/016/41200/145/001330	Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p.o.	Modernizace služeb poskytovaných městským kulturním střediskem	3212	1 510 051
12/016/41200/145/001339	Hasiči sobě - Krásno	Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba nové	3212	1 800 000
12/016/41200/145/001340	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRASLICE	Obnova cvičebního sálu - obnova Sokolovny - II. etapa	3212	1 799 518
12/016/41200/145/001349	Základní škola Habartov	Stavební úpravy školní družiny	3212	1 800 000
12/016/41200/145/001352	Obec Dolní Nivy	Objekt občanské vybavenosti - úprava střechy	3212	703 861
12/016/41200/145/001353	Město Kraslice	Stavební úpravy za účelem obnovy hřbitovní kaple se zvonici v Tisové	3220	792 038
12/016/41200/145/001357	Iveta Soukupová	Interaktivní expozice života našich předků	3220	1 800 000
12/016/41200/145/001444	Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s.	Kurz specifické cizojazyčné komunikace pro trhovce a řemeslníky	3310	525 000





## 7. výzva (5/2013)

Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s.

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/341/000145

Registrační číslo	Název subjektu	Název projektu	Hlavní opatření	Dotace (Kč)
13/019/41200/145/001535	Městys Svatava	Pořízení techniky na údržbu zeleně ve Svatavě	3211	442 800
13/019/41200/145/001540	Město Loket	"Loket předlážďení pěší zóny"	3211	1 800 000
13/019/41200/145/001548	"Hartenberg o.s."	Obnova školy v Hřebenech pro vzdělávací projekty	3212	1 270 052
13/019/41200/145/001554	Město Chodov	Stará Chodovská - občanská vybavenost	3212	1 800 000
13/019/41200/145/001593	Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov	Přírodní zahrada MŠ U Sluníčka Horní Slavkov	3212	838 471
13/019/41200/145/001599	"Mikroregion Sokolov-východ"	Integrovaný projekt drobné architektury	3220	1 057 950
13/019/41200/145/001604	Obec Lomnice	Kostel sv. Jiljí - obnova krovu věže	3220	611 901
13/019/41200/145/001612	VLADIMÍR LOKAJ	Restaurace a penzion Fara Krásno	3132	1 200 000
13/019/41200/145/001618	JAN HÁLA	Rozšíření a dovybavení lanového parku v Lokti	3132	194 623
13/019/41200/145/001637	PAVEL MAKON	Stavba truhlárny ve Svatavě	3120	1 200 000
13/019/41200/145/001646	ROMAN ZLESÁK	Rozvoj výroby hudebních nástrojů na Kraslicku	3120	562 380
13/019/41200/145/001659	AMB AUTO s.r.o.	Tělocvična - rekonstrukce posilovny a její vybavení	3120	1 200 000
13/019/41200/145/001687	Město Oloví	Rozhledna "Cibulka" 2 etapa	3131	1 800 000

56

## 8. výzva (1/2014)

Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s.

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/341/000145

Registrační číslo	Název subjektu	Název projektu	Hlavní opatření	Dotace (Kč)
14/020/41200/145/000078	VIVAT MUSICA KRASLICE, občanské sdružení	Mobilní ozvučné zařízení s příslušenstvím	3212	94 500
14/020/41200/145/000082	Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov	Pořízení velkoplošné informační LED obrazovky	3212	270 000
14/020/41200/145/000114	Město Krásno	KULTURNÍ DŮM KRÁSNO - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ	3212	270 000
14/020/41200/145/000121	Pomoc v nouzi, o.p.s.	Vybavení Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří	3212	229 725
14/020/41200/145/000125	Základní škola Březová, okres Sokolov	"Počítačovou technikou k vyšší vzdělanosti"	3212	186 750
14/020/41200/145/000129	Městské kulturní středisko Habartov, příspěvková organizace	Ozvučení kina	3212	206 550
14/020/41200/145/000131	Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace	Modernizace zázemí a zvukové aparatury MKS Kynšperk	3212	219 600
14/020/41200/145/000137	Obec Dolní Rychnov	Vital park - Dolní Rychnov	3212	186 256
14/020/41200/145/000138	Tradiční řemesla Bernard, o.s.	"Vzdělání pracovníci v CR - nová šance pro rozvoj Sokolovska"	3310	351 639

